

Pielikums

Balvu novada attīstības programmas 2011-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojumam par 2014.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2014.gadu



Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam saskaņota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Koordinācijas padomes sēdē 2011.gada 7.septembrī un apstiprināta Balvu novada Domes sēdē 2011.gada 8.septembrī (domes sēdes prot.Nr.17, 35.§). Balvu novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikta attīstības vīzija, attīstības prioritātes un stratēģiskie mērķi, un to sasniegšanai noteiktas rīcības septiņu gadu periodam. Tas ir dokuments Balvu novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.

Attīstības programma sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir veikta novada pašreizējās situācijas un SVID analīze. Balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem, attīstības programmas otrajā daļā ir noformulēta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un vidēja un ilgtermiņa prioritātes, trešajā daļā ir ietverts rīcības plāns un investīciju plāns. Investīciju programma sagatavota 3 gadiem, tas ir programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto prioritāšu, to mērķu, pasākumu un rīcību īstenošanas instruments.

2014.gada 13.martā apstiprināta jauna Investīciju programma 2014. – 2017.gadam (domes sēdes prot.Nr.4, 36.§). Dokuments aktualizēts, jo laika termiņš iepriekšējai Investīciju programmai 2011. – 2013.gadam noslēdzies, un bija nepieciešams pārskatīt plānotās projekta aktivitātes, kā arī izstrādāt jaunus pasākumus, ņemot vērā ES jaunā plānošanas perioda 2014.-2020.gadam pieejamos finanšu resursus. Dokumentam apzinātas, apkopotas un sagatavotas pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzības 2014.-2020.gadam un iekļauts ar Balvu novada Domes 2012.gada 24.februāra lēmumā (sēdes prot. Nr.4,1.§) “ Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” noteiktie indikatīvo vajadzību projekti:

✓ Balvu novada pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti 2014.-2020.,

- ✓ projekti par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā,
- ✓ projektu idejas un investīciju apjoms, kas ir nepieciešams investoru piesaistei ar vismaz 1 milj. investīcijām 2014.-2020.gadam.
- ✓ apstiprinātā Balvu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2014. – 2020. gadam aktivitātes,
- ✓ Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektu aktivitātes,
- ✓ Darbības programmas aktivitātes Latvijai noteikto ES 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanai (*deviņi* prioritārie virzieni: Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas; Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi; Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja; Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs; Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte; Ilgtspējīga transporta attīstība; Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana; Izglītība, prasmes un mūžizglītība; Pilsētvides attīstība),
- ✓ ETS (Eiropas Teritoriālā sadarbība) instrumenta provizoriskās projektu aktivitātes (prioritārie tematiskie mērķi: veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās; uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju; veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību; ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā; aizsargāt vidi un veicināt resursu efektivitāti; veicināt nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka mobilitāti; nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovācijas; uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi),
- ✓ Balvu novada ilgtspējīgā stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktās prioritārās aktivitātes,
- ✓ “pārejošie projekti” no investīciju programmas 2011.-2013.gadam (uzsākie projekti, projekti ar periodiskumu, neīstenotie projekti), kā arī pašvaldības institūciju izvērtētie prioritārie projekti.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts, 12.panta pirmā daļa izstrādāta un 2014.gada 13.februāra Balvu novada Domes sēdē (prot.Nr.2, 6.§) apstiprināta Balvu novada ilgtspējīga attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā kā ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes, telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. Balvu novada nākotnes attīstības vīzija – Balvu novads 2030. gadā veido Ziemeļlatgales ekonomiskās attīstības, pakalpojumu un pārrobežu sadarbības centru.

2008. gadā Eiropas Komisija dibināja Pilsētu mēru paktu, lai apstiprinātu un atbalstītu vietējo pašvaldību centienus ilgtspējīgas enerģētikas politikas īstenošanā. Balvu novada pašvaldība pievienojoties Pilsētas mēru paktam 2012.gada 13.decembrī, savā teritorijā brīvprātīgi apņēmoties palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamus enerģijas avotus. Pakta parakstītāji īpaši apņemas sagatavot bāzes emisiju uzskaiti un gada laikā no Pakta parakstīšanas brīža iesniegt ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, kurā aprakstītas galvenās plānotās darbības. Balvu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2014. – 2020. gadam, apstiprināts ar Balvu novada Domes

16.01.2014.lēmumu Nr.1, 44.§. Plāna mērķis ir apzināt aktuālo situāciju pašvaldībā un izstrādāt rīcības, kas sekmēs CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 20% līdz 2020.gadam salīdzinājumā ar 2005.gadu. Rīcības plāns sastāv no divām daļām. Pirmā daļa aptver – politikas plānošanas dokumentu ietvaru, novada vispārējais raksturojums, CO2 emisijas, kā arī rīcības plāna izpildi un monitoringu, savukārt otru daļu jeb pielikumus sastāda elektroniskās tabulas, kas apkopo informāciju par bāzes emisiju un 2012.gada enerģijas patēriņa datiem, kā arī plānotajām darbībām atbilstošajās darbības jomās.

2014.gadā novada pašvaldība, atbalstot un nodrošinot nacionālās valūtas lata nomaiņas pasākumus, sekmīgi veica pāreju uz jaunu nacionālo valūtu *euro*.

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojuma par 2014.gadu mērķis ir veikt plānošanas dokumenta ieviešanas novērtējumu, izvērtēt rezultātus, kā arī sniegt informāciju sabiedrībai un lēmējvarai par pašvaldības darba rezultātiem .

Balvu novada vispārīgs sociāli ekonomiskā stāvokļa raksturojums


Balvu novads atrodas Austrumlatvijas zemienes ZA daļā, Ziemeļlatgalē, 220 km no Rīgas, 80 km no Rēzeknes, 150 km no Pleskavas (Krievija) un 200 km no Tartu (Igaunija). Novada platība 1045,21 km².

Balvu novads izveidots 2009.gadā pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Balvu novada administratīvajā teritorijā ietilpst Balvu pilsēta un 10 pagasti – Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas un Vīksnas.

Balvu pilsētas teritorijas platība ir 5,1 km²

2014.gadā no novada zemes platībām meži aizņem 38%, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 40 %, purvi 10%, krūmāji 5%. Savukārt zeme zem ūdeņiem un zivju dīķiem 2% no kopējās novada teritorijas. Salīdzinot ar 2013.gadu, pārskata gadā ir pieaugušas mežu zemes platības un samazinājusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības (skat.attēlu Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 2014. un 2013.g. (ha) Balvu novadā. Avots:LAD datu bāze).

Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 2014. un 2013.g. (ha) Balvu novadā

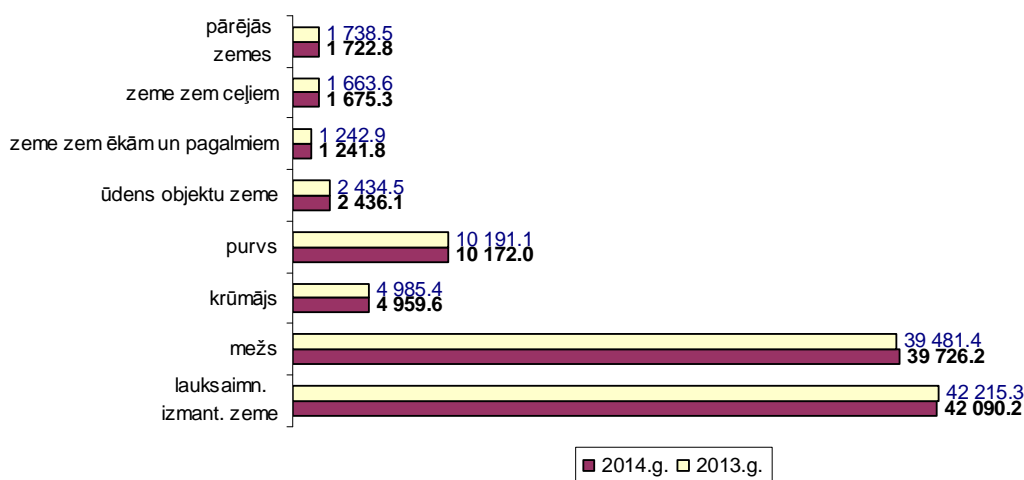


Balvu novadā ir vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – 4 dabas liegumi: Lubāna mitrājs, Orlovas (Ērgļu) purvs, Stompaku purvi, Sitas un Pededzes paliene. Novada administratīvais centrs ir Balvu pilsēta, kas ir reģiona nozīmes centrs. Balvi iekļaujas Latgales reģiona austrumu pilsētu tīklā, ko sasaista „Austrumu stīga” – perspektīvais nacionālas nozīmes transporta koridors, kas palīdzēs stiprināt pilsētas lomu saskaņā ar tās potenciālu un īpatnībām un uzlabos sociāli ekonomisko situāciju austrumu pierobežā.

Novads robežojas ar Gulbenes, Rugāju, Baltinavas, Viļakas, Kārsavas, Lubānas, Rēzeknes, Madonas un Alūksnes novadiem, ar kuriem to saista dažādas sociāli ekonomiskās saites.

Nozīmīgākie novada teritoriju šķērsojošie valsts ceļi ir P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi), P 47 Balvi-Kapūne un P 36 Rēzekne-Gulbene, P 45 Viļaka-Kārsava. Balvu pilsēta ir Latgales reģiona lielākais saimnieciskais centrs tā Ziemeļu daļā.


Uz 2015.gada sākumu Balvu novadā pastāvīgi dzīvoja 14257 iedzīvotāji. Pēdējo 5 gadu laikā, kopš 2010.gada, novada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 9% jeb 1417 personām (skat.attēlu Iedzīvotāju skaita dinamika Balvu novadā 2010.g.-2015.g. Avots: PMLP datu bāzes).

Iedzīvotāju skaita dinamika Balvu novadā 2010.g.-2015.g.

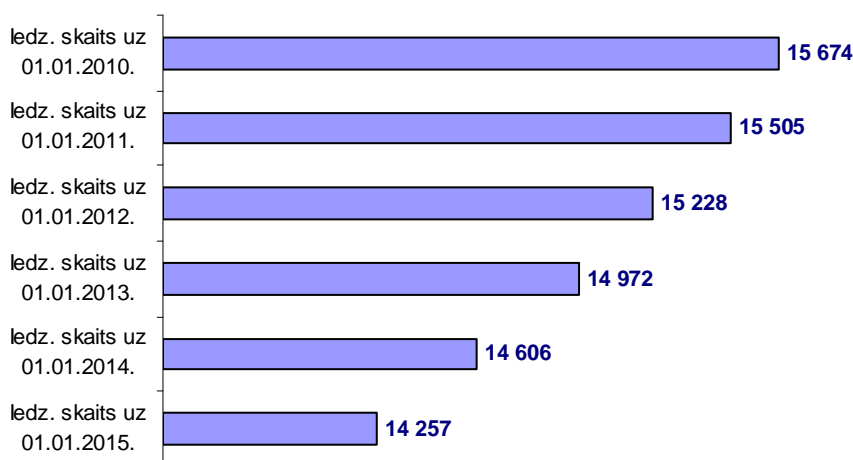


Demogrāfiskā situācija novadā ir nelabvēlīga. Gan iedzīvotāju dabiskais pieaugums, gan migrācijas saldo ir negatīvi. Pieaug no novada izbraukušo personu īpatsvars iedzīvotāju skaita izmaiņu negatīvajā bilancē (Avots: CSP statistikas datu bāzes).

Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori Balvu novadā

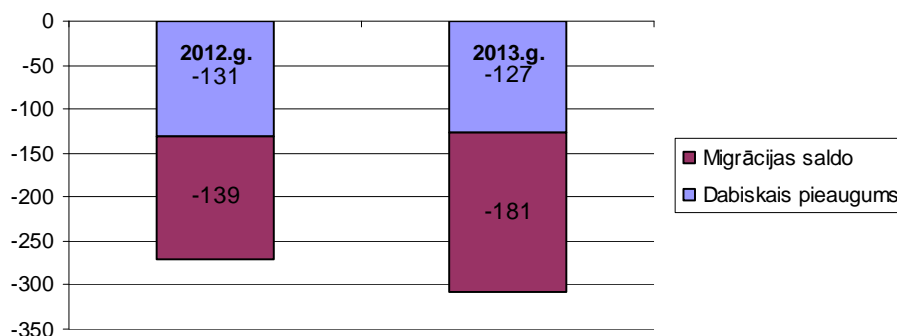

Pieaug demogrāfiskā slodze uz iedzīvotājiem darbības vecumā. Slodzes struktūrā 60% ir darbības vecumu pārsniegušie un 40% bērni līdz darbības vecumam (skat.attēlu Demogrāfiskās slodzes līmenis Balvu novadā, gada sāk. Avots: CSP statistikas datu bāzes).


Demogrāfiskās slodzes līmenis Balvu novadā, gada sāk.



darbības vecumu nerasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000 pers.darbības vecumā


Novada administratīvajā centrā – Balvu pilsētā dzīvo 51% iedzīvotāju un 49% pagastos.

Iedzīvotāji sadalījumā pēc dzīvesvietas Balvu novadā 2014.gada beigās (%)




Bezdarbs Balvu novadā samazinās, taču tā līmenis joprojām ir augsts. Latgales statistikas reģiona teritorijā bezdarbs ir par 1,8 % zemāks, bet valstī kopumā pat 2.3

reizes zemāks nekā Balvu novadā (skat.attēlu par bezdarba līmeni. Avots: CSP datu bāze).




Lielāko ieguldījumu novada saimnieciskajā attīstībā dod šādas dominējošās tautsaimniecības nozares – medniecība, mežizstrāde, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, mazumtirdzniecība, jauktā lauksaimniecība, graudaugu audzēšana, automobiļu apkope un remonts.

Nozaru uzņēmumu skaits Balvu novadā sakārtojumā pēc nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2014.gadā



Nodarbināto iedzīvotāju daba alga novadā pieaug un strādājošo vidējā darba samaksa mēnesī 2014.gada sākumā ir 542 euro (skat.attēlu Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Balvu novadā. Avots:CSP datu bāze).


Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Balvu novadā, euro



Novada kā apdzīvotas vietas pievilcību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti nosaka gan uzņēmējdarbības vide, gan kultūras infrastruktūra, gan kvalitatīvas izglītības iespējas. Balvu novada iedzīvotāju veiktajā aptaujā par dzīves apstākļu izmaiņām pēdējā gada laikā, 17% no respondentiem atbildējuši, ka tie ir uzlabojušies un 49% respondentu norādījuši, ka apstākļi nav mainījušies.

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam ieviešanas rezultāti


Plānošanas dokumentā noteikts novada galvenais ilgtermiņa mērķis – **novada konkurētspējas palielināšana**. Tā īstenošanai noteiktas darbības prioritātes.

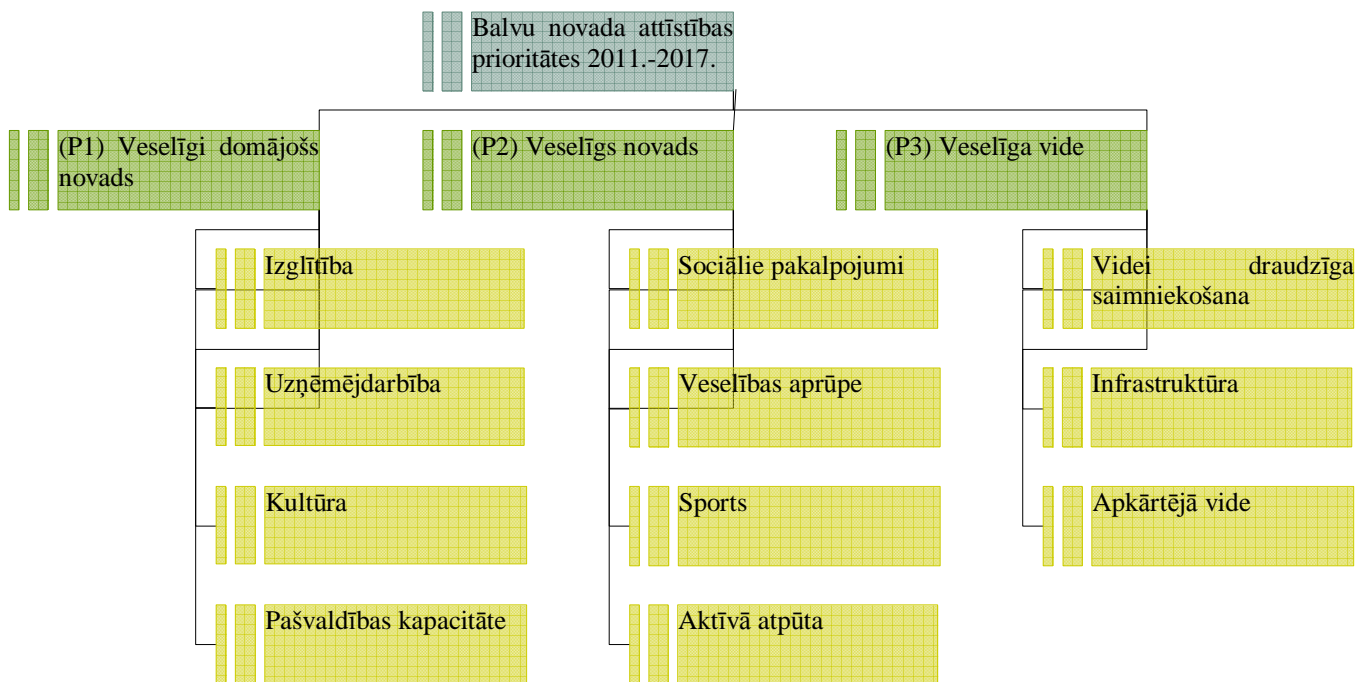

Pašvaldībai veicot rīcības noteiktajās vidēja termiņa prioritātēs jāsekmē novada konkurētspējas palielināšana.


Novada iedzīvotāju viedokļu, priekšlikumu un iebildumu par pašvaldības darba un dzīves telpas kvalitātes izpētei, lai novērtētu Balvu novada attīstības programmas īstenošanu, veikta aptauja. Iegūtā informācija iekļauta uzraudzības ziņojumā. Anketēšana notikusi visās administratīvajās vienībās.

Respondentu struktūra pēc dzīvesvietas novada teritoriālajās vienībās




Respondentu atbildes visvairāk saņemtas no Balvu pilsētas iedzīvotājiem, bet vismazākais respondentu aptvērums ir Vectilžas pagastā.

Aptaujā piedalījušos skaits un dzīvesvieta

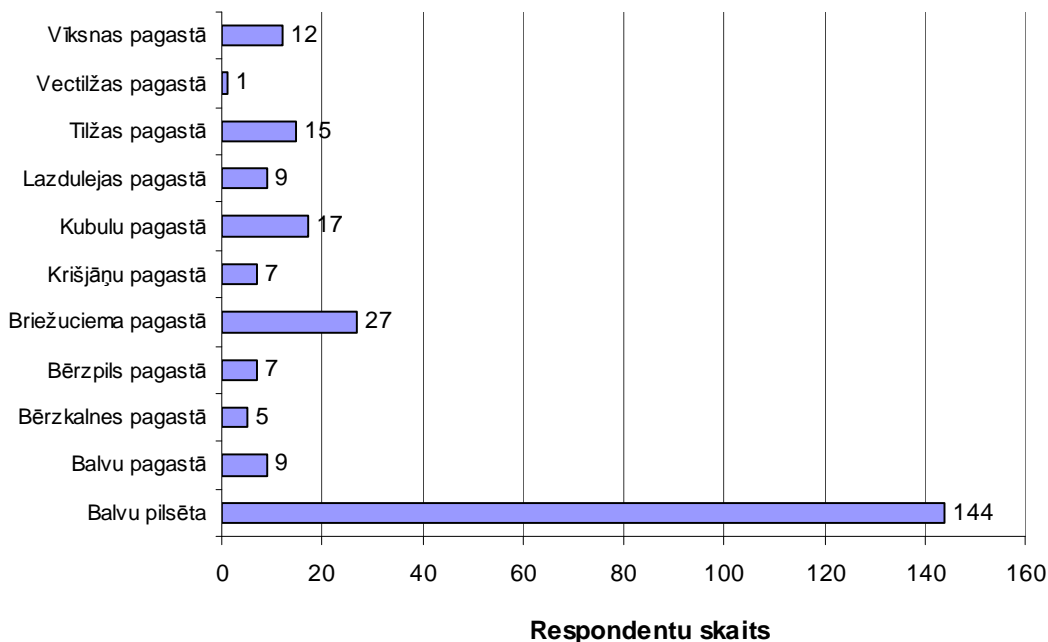

Aptaujā piedalījušies 253 respondenti, lielākais skaits ir vecumā no 26 līdz 50 gadiem - 55%, bet vismazāk – vecumā līdz 18 gadiem – 2% no anketu aizpildījušiem.

Respondentu vecuma struktūra



Prioritātes mērķu vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti un rīcību rezultatīvie rādītāji Balvu novadā

Plānošanas dokumentā iekļauti sasniedzamie rezultāti, kas raksturo mērķu īstenošanas pakāpi un attīstības tendences.

1. Prioritāte - Veselīgi domājošs novads

1.prioritātē noteikti šādi mērķi: izglītības pieejamības un kvalitātes uzlabošana, sakārtota uzņēmējdarbības vide radošas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošināti kvalitatīvi kultūras pakalpojumi, administratīvo funkciju efektivitātes nodrošināšana.

Prioritātes mērķu vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti un rīcību rezultatīvie rādītāji:

Prioritāte, mērķis	Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti un bāzes rādītāji	Rīcību īstenošanas rezultatīvie rādītāji				Datu ieguves avoti
		2012.g. un attīstības tendence	2013.g. un attīstības tendence	2014.g. un attīstības tendence	2017.g. un attīstības tendence	
(Pr.1.) VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS						
<i>Prioritātes mērķis ir attīstīt radošus, inovatīvus, ekonomiski aktīvus cilvēkus, kuri veido uzņēmumus, darba vietas, aktīvu kultūras dzīvi, piesaista</i>	Bezdarba rādītājs turpina samazināties (2011. gada sākumā 18,7 %). Zem 10 % NVA	17.1%, 2012.gada beigās ↓	16.6%, 31.12.2013. ↓	15.2%, 31.12.2014. ↓	Zem 10 % ↓	NVA
	Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieauguma tendence ir stabila (IIN ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju novada budžetā ir vieni no lielākajiem Latgales reģionā, LVL 155 (EUR221) uz vienu iedzīvotāju 2009. gadā)	LVL 201 (EUR 286) uz vienu iedzīvotāju 2012.gadā ↑	LVL 219 (EUR 312) uz vienu iedzīvotāju 2013.gadā ↑	EUR 337 uz vienu iedzīvotāju 2014.gadā ↑	Vairāk kā 15 % pieaugums ↑	VID, Novada dome, CSP

tūristus	Mazo uzņēmumu skaita pieaugums (2010.gadā novadā darbojās 813 uzņēmumi, no tiem 297 Balvu pilsētā, 20 kokapstrādē)	871 uzņēmumi ↑	916 uzņēmumi, t.sk. 362 Balvu pilsētā ↑	909 uzņēmumi, t.sk. 362 Balvu pilsētā ↓	860 uzņēmumi, 25 kokapstrādē ↑	Lursoft, CSP
	Pieaugošs tūristu skaits Balvu novadā (2010. gadā 22 tūkst. cilvēku) 30 tūkst. cilvēku.	27 tūkst. cilvēku ↑	27 tūkst. cilvēku ⇒	22 tūkst. cilvēku ↓	30 tūkst. cilvēku ↑	TIC

Apzīmējumu skaidrojums:


- ↑ Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu
- ↓ Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu
- ⇒ Nav notikušas izmaiņas
- ↑ Pieaugums ar negatīvu vērtējumu
- ↓ Samazinājums ar negatīvu vērtējumu

2014.gadā divi rādītāji samazinājušies ar negatīvu vērtējumu. Uzņēmumu skaits samazinājies par 7, negatīvās izmaiņas skaidrojamas ne tik daudz ar tautsaimniecības situācijas pasliktināšanos, kā ar uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta mērķtiecīgu darbību, izslēdzot no reģistriem uzņēmumus, kuri jau ilgstoši neveic saimniecisko darbību (Lursoft pētījums). Vidējā termiņā sasniedzamais rezultāts izpildīts.

Tūristu skaits samazinājies, jo apmeklētājiem bija slēgts Balvu novada muzejs, kurā tika veikta ekspozīciju rekonstrukcija, un Dundenieku keramikas darbnīca, arī rekonstrukcijas dēļ, neuzņēma interesentus.


Iedzīvotāju viedokļu izzināšanai, jautājumā par izglītības un kultūras, saimniecisko pakalpojumu un finanšu norēķinu pieejamību, ir saņemtas šādas atbildes(skat. attēlu 4.Vai Jūs apmierina šo pakalpojumu PIEEJAMĪBA dzīvesvietā?). Vispozitīvāk tiek vērtēti pasta pakalpojumu, izglītības sfēras un kultūras pasākumu pieejamība. Sabiedriskā transporta un policijas, maksājumu un finanšu norēķinu pieejamība vērtēta negatīvi.

4.Vai Jūs apmierina šo pakalpojumu PIEEJAMĪBA dzīvesvietā?




Respondenti snieguši atbildes par vēlamajiem kultūras pasākumiem, kas būtu jāpaplašina. Īpašs uzsvars ir uz vieskoncertiem, viesizrādēm, kā arī festivālu un svētku organizēšanu (skat.attēlu 5. Kādu kultūras pasākumu norises jāpaplašina novadā?).

5. Kādu kultūras pasākumu norises jāpaplašina novadā?



Aptaujas dalībnieki novērtējuši pakalpojumu kvalitāti, un vispozītīvākās atsauksmes ir par bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem un kultūras pasākumiem. Diemžēl neapmierinoši vērtēts pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai, kā arī interesanta un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem (skat.attēlu 7.Vai Jūs apmierina pašvaldības darbības kvalitāte atbalsta un pakalpojumu nodrošināšanā?).

7.Vai Jūs apmierina pašvaldības darbības kvalitāte atbalsta un pakalpojumu nodrošināšanā?



Prioritātes 1 - **VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS** – mērķu: attīstīt radošus, inovatīvus, ekonomiski aktīvus cilvēkus, kuri veido uzņēmumus, darba vietas, aktīvu kultūras dzīvi, piesaista tūristus, īstenošanas aktivitātes:

Īstenoti projekti

Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija.1.kārta
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas vidusskolā
Politiski represēto piemiņas saglabāšana
Infrastruktūras labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Tilžas pagastā

Tūrisma infrastruktūras attīstība Balvu novadā
Aprīkojuma iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales Biznesa centrs” organizētajam lauku labumu tirdziņam, uzlabojot un dažādojot dzīves kvalitāti novada vietējiem iedzīvotājiem
Krucifiksu atjaunošana Vīksnas pagastā
Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
KUSTĪBA.DEJA.RITMS.
MĒS TO VARAM!
Radiotilts
Latvijas-Krievijas pārrobežu projekts „Pasargāt, lai nepazaudētu - kultūras mantojuma saglabāšana”
Latgales latviešiem svarīgo kultūras lauku skaidrojums Rēzeknes augstskolas jaunākajos pētījumos (lektorijs Ziemeļlatgales kultūras darbiniekiem)
ES mūžizglītība, skolu daudzpusēja partnerība, Balvu Amatsnecības vidusskola
Kompleksi risinājumi ēku energoefektivitātes uzlabošanai Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”
15.kamermūzikas festivāls Balvos (KKF)
III Starptautiskais tautas deju festivāls „Eima,eima” (KKF)
Deju kopas Rika dalība festivālā „Folk Fiesta Nysa 2014” (KKF)
Ziemeļlatgales kultūras darbinieku tālākizglītība ar Juri Cibuli.Lektorijs. (KKF)
Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana (KKF)
Tu raksti, es lasu 3 (KKF)

Uzsākta un turpinās projektu īstenošana

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas internātpamatskolā.
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internētā
Latvijas -Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu projekts Museum Gateway
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Balvu novadā
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamtdarbības Nr.2(KA 1) stratēģisko skolu sadarbības partneru projekts
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamtdarbības Nr.2(KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partneru projekts
United in Diversity (Nordplus junior 2014 programmas ievaros)

2014.gadā īstenoti 22 projekti un turpinās vēl septiņi projekti, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības un kultūras vides pieejamību, sekmētu uzņēmējdarbību.

2. Prioritāte -Veselīgs novads


Prioritātē 2 noteikti šādi mērķi: sociālo un veselības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, sporta un veselīgas atpūtas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Prioritātes mērķu vidējā termiņa sasniedzamie rezultāti un rīcību rezultatīvie rādītāji:

Prioritāte, mērķis	Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti un bāzes rādītāji	Rīcību īstenošanas rezultatīvie rādītāji				Datu ieguves avoti
		2012.g. un attīstības tendence	2013.g. un attīstības tendence	2014.g. un attīstības tendence	2017.g. un attīstības tendence	
(Pr.2.) VESELĪGS NOVADS						
<i>Prioritātes mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos un veselības pakalpojumus, kā arī veicināt veselīgu dzīves veidu attīstot sporta un veselīgas atpūtas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un tūristiem.</i>	Iedzīvotāju skaits nesamazinās (2011. gada sākumā 15505 iedzīvotāji)	14 972 iedzīvotāji (2012. gada beigās) ↓	14 606 iedzīvotāji (2013. gada beigās) ↓	14 257 iedzīvotāji ↓	15 510 iedzīvotāji ⇒	CSP
	Iedzīvotājiem ir nodrošināti plaša spektra kvalitatīvi aktīvās atpūtas un sporta pakalpojumi (2010. gada aptauja – nepieciešami aktīvās atpūtas un sporta pakalpojumu pieejamības uzlabojumi, īpaši jauniešiem)	Nav datu	39.4% no respondentiem pozitīvi vērtē atpūtas un sporta pasākumu pieejamību ↑	56.2% no respondentiem apmierināti ar tautas (masu) sporta pasākumu pieejamību ↑	Iedzīvotāju apmierinātība ar kultūras un sporta jomu ↑	Aptauja
	Iedzīvotājiem ir nodrošināti kvalitatīvi nepieciešamie sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi (2010. gada aptauja – iedzīvotāju uzsver, ka nepieciešami uzlabojumi)	Nav datu	15.5% no respondentiem vispozitīvāk vērtē sociālo pakalpojumu pieejamību un veselības jomu ↑	50.6% no respondentiem apmierināti ar sociālo pakalpojumu un veselības jomas pieejamību ↑	Iedzīvotāju apmierinātība ar sociālo un veselības jomu ↑	Aptauja


Prioritātes 2 mērķa īstenošanas rezultatīvo rādītāju attīstības tendences uzrāda, ka lai arī ar pakalpojumu (aktīvās atpūtas un sporta, sociālās un veselības sfēras) pieejamību iedzīvotāju apmierinātība pieaug, iedzīvotāju skaita sarukšanu tas neietekmē, un iedzīvotāju skaita izmaiņas ar negatīvu tendenci turpinās.

4.Vai Jūs apmierina šo pakalpojumu PIEEJAMĪBA dzīvesvietā?




Aptaujas dalībnieku atbildes norāda, ka gan veselības aprūpes, sociālie pakalpojumu un organizētas masu sporta aktivitātes ir pieejamas. Ļoti apmierināti un apmierināti ir 53% respondentu par veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību un 56% respondentu par aktīvās atpūtas un masu sporta pasākumu pieejamību.

7. Vai Jūs apmierina pašvaldības darbības kvalitāte atbalsta un pakalpojumu nodrošināšanā?



Veikto aktivitāšu pakalpojumu kvalitāti respondenti vērtē līdzīgi: apmierina un ļoti apmierina 50%, neapmierina un ļoti neapmierina 27% un nevarēja atbildēt 23% aptaujāto par sociālās palīdzības pakalpojumu nodrošināšanu, ar masu sporta pasākumu kvalitāti apmierināti un ļoti apmierināti ir 52% , neapmierina un ļoti neapmierina 29% un nevarēja atbildēt 19% respondentu.

6. Kādos sporta veidos nepieciešams aktivizēt masu sporta pasākumus novadā?



Kā viens no populārākajiem sporta veidiem, kas būtu aktivizējams novadā, respondenti atzīmē slēpošanu. Tāpat aptaujas dalībnieki īpaši atbalstījuši airēšanas, autosporta, volejbola un peldēšanas aktivitātes, kuru norises novadā vēlētos attīstīt un paplašināt. Iedzīvotāji izteikuši vēlmi dažādot un paplašināt masu sporta pasākumus.

Prioritātes 2 - **VESELĪGS NOVADS** – mērķu: nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos un veselības pakalpojumus, kā arī veicināt veselīgu dzīves veidu attīstot sporta un veselīgas atpūtas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un tūristiem, īstenošanas aktivitātes:

Īstenoti projekti

Grupu mājas pakalpojumu sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem Balvu novadā

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā

Uzsākta un turpinās projektu īstenošana

Dienas centra pakalpojumu nodrošinājuma uzlabošana Balvu novada iedzīvotājiem

Healthy people for a prosperous Europe (Comenius)

3. Prioritāte - Veselīga vide

Prioritātē 3 noteikti šādi mērķi: videi draudzīga saimnieciska darbība, lauku un pilsētas zaļo teritoriju sakopšana un izmantošana.


Prioritātes mērķu vidējā termiņa sasniedzamie rezultāti un rīcību rezultatīvie rādītāji:

Prioritāte, mērķis	Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti un bāzes rādītāji	Rīcību īstenošanas rezultatīvie rādītāji				Datu ieguves avoti
		2012.g. un attīstības tendence	2013.g. un attīstības tendence	2014.g. un attīstības tendence	2017.g. un attīstības tendence	
(Pr.3.) VESELĪGA VIDE						
<i>Prioritātes mērķis ir novadā veidot veselīgu un kvalitatīvu dzīves vides telpu, nodrošināt dzīves kvalitāti.</i>	Sakopta pilsētas un ciemu zaļā teritorija.	Sakopta pilsētas un ciemu zaļā teritorija. ↑	Turpinās pilsētas un ciemu zaļo teritoriju labiekārtošana ↑	Tiek uzturētas, sakoptas pilsētas un ciemu zaļās teritorijas ⇒	Labiekārtoti pilsētas parki un skvēri ↑	Novada dome
	Neizmanto lauksaimniecības zemju platības samazinājums (2010. gadā neapstrādātā LIZ ir 6430 ha jeb 15%)	5280 ha jeb 13% ↓	7385 ha jeb 18% ↑	8450 ha jeb 21% ↑	Vairāk kā 20% samazinājums ↓	Latvijas lauku saimn. uzskaites tīkls
	Energoefektivitāte pašvaldībās iestāžu ēkās (20% procenti ēku)	20% ēku ⇒	43% ēku ↑	43% ⇒	60% ēku ↑	Novada dome
	Lauksaimniecības un amatniecības sasaiste ar tūrismu (10 pakalpojumu piedāvātāji tūristiem 2010. gadā)	13 pakalpojumu piedāvātāji tūristiem ↑	16 pakalpojumu piedāvātāji tūristiem ↑	17 pakalpojumu piedāvātāji tūristiem ↑	20 pakalpojumu piedāvātāji tūristiem ↑	TIC
	Sakārtota ceļu un ielu infrastruktūra	Tiek veikta ceļu un ielu infrastruktūra sakārtošana ↑	Turpinās ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana (pēc aptaujas rezultātiem viena no jomām ar vispozitīvākām pārmaiņām) ↑	Turpinās ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana ↑	Visi ciemu centri sasniedzami pa asfalta seguma ceļu. Pilsētas ielu kvalitāte ir apmierinoša (aptaujas rezultāti) ↑	Novada dome

Prioritātes 3 mērķu īstenošanai noteikti 5 rezultatīvie rādītāji. 2014.gadā sasniegti šādi pozitīvi rezultāti- turpinās ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana, pieaudzis pakalpojumu piedāvātāju skaits, nemainīgi palikuši energoefektivitātes aktivitāšu apjomi, tiek uzkoptas zaļās teritorijas, bet pieaugušas neizmanto lauksaimniecības zemju platības.


Apstrādāto lauksmainiecības zemju samazinājums ir skaidrojams ar to, ka 2013.gadā ir mainījušās prasības - zemes īpašniekam jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai tā tiktu uzskatīta par apstrādātu.

8.Vai Jūs apmierina pašvaldības darbības kvalitāte dzīves vides un infrastruktūras uzlabošanā?

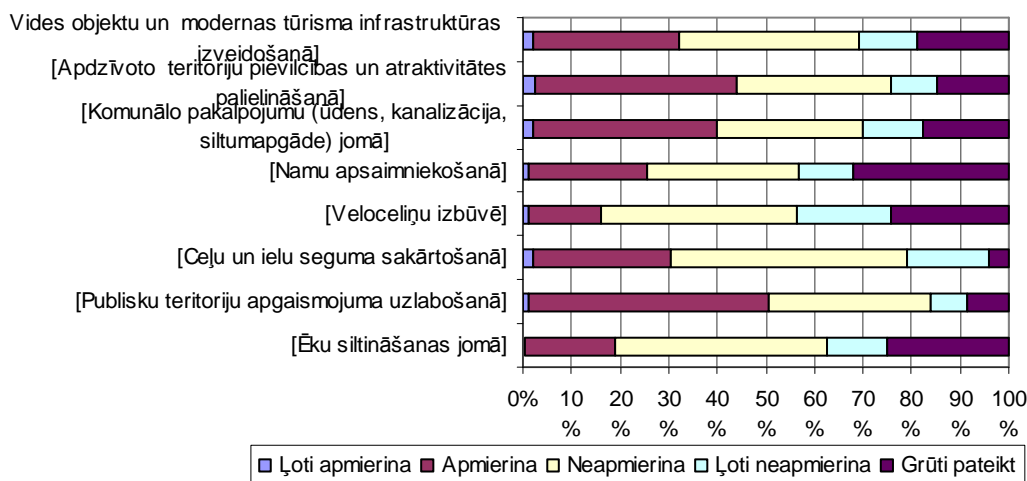

Vispozitīvāk iedzīvotāji vērtē pašvaldības darbu apdzīvoto teritoriju pievilcības un atraktivitātes palielināšanā, komunālo pakalpojumu jomā, kā arī publisko teritoriju apgaismojuma uzlabošanā. Bet vairāk neapmierina pašvaldības darbības kvalitāte – veloceliņu izbūvē, ēku siltināšanas jomā, kā arī ceļu un ielu seguma sakārtošanā. Jāpiebilst, ka kopumā atbilžu struktūra pēc iedzīvotāju vērtējuma par nosauktajām darbības jomām ir šāda: apmierināti un ļoti apmierināti ar pašvaldības darbu dzīves vides un infrastruktūras uzlabošanā ir 32% no respondentiem, nepmierina un ļoti neapmierina- 50%, bet 18% no respondentiem nevarēja novērtēt pašvaldības aktivitātes.

9. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pilsētā/pagastā?

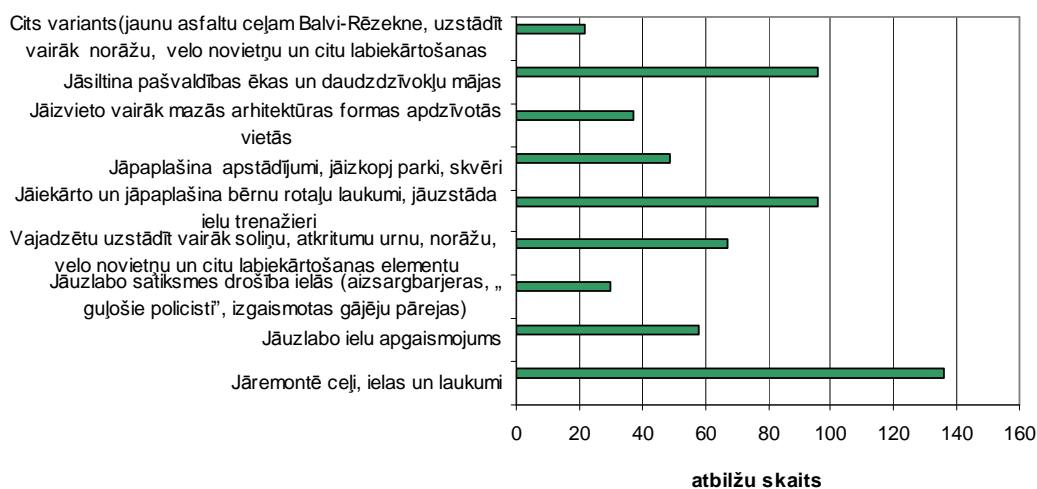

Aptaujas dalībnieki atzīmējuši, ka pašvaldībai aktīvāk jāveic šādas darbības – jāremontē ceļi, ielas un laukumi, jāpaplašina bērnu rotaļu laukumi un jāuzstāda ielu trenāžieri, jāsiltina pašvaldības ēkas un daudzdzīvokļu mājas.

Prioritātes 3 - **VESELĪGA VIDE** – mērķu: novadā veidot veselīgu un kvalitatīvu dzīves vides telpu, nodrošināt dzīves kvalitāti aktivitātes.

Īstenoti projekti

Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā, I. kārtā
Gājēju tiltiņa izbūve Bērzpils pagastā
Zandartu mazuļu ielaišana Balvu ezerā
Zivju resursu palielināšana Pērkonu ezerā
Zivju resursu aizsardzība Balvu novada ezeros
Ezera sonāte

Uzsākta un turpinās projektu īstenošana


New Flavour of Your Life: Promoting Active Citizenship and Health Awareness through Gardening in Towns and Cities
Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka
Tūrisma infrastruktūras attīstība Balvu novadā
Ūdenssaimniecība Kubulu pagasta Kurnas ciemā
Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana

2014.gadā īstenoti seši projekti vides aizsardzības, kā arī teritoriju labiekārtošanas un vides objektu izveidē. Turpinās vēl pieci projekti ceļu, ūdenssaimniecības, tūrisma infrastruktūras un zaļās pilsētvides uzlabošanā.

Rādītāji, kas tiek iegūti veicot iedzīvotāju aptauju, sniedz informāciju par pašvaldības darbības efektivitāti attīstības programmas īstenošanā.

Ievērojams respondentu skaits (38%) , kas savu informētību par pašvaldības nākotnes iecerēm un aktualitātēm vērtē kā informācijas trūkumu un 39% ir vispārīgi informēti, 13% nevarēja sniegt atbildi un tikai 9% vērtē, ka ir pilnīga informācija par pašvaldības nākotnes iecerēm (skat.attēlu zemāk).


10.Vai esat informēts par aktualitātēm un pašvaldības nākotnes iecerēm pagastā/pilsētā?



Jautājot, kur iedzīvotāji iegūst pilnīgāko informāciju par aktualitātēm pašvaldības darbā, lielākajā atbilžu daļā norādīta pašvaldības mājaslapa www.balvi.lv, kā arī


drukātie izdevumi „ Novada ziņas” un „ Vaduguns”. Tikai nelielā atbilžu skaitā atzīmētas pašvaldības un iedzīvotāju informatīvās tikšanās (skat.attēlu zemāk).

11.Kur Jūs iegūstat pilnīgāko informāciju par aktualitātēm pašvaldības darbā?




Lielākais vairums respondentu (65%), atbildot uz jautājumu par iespējamo dzīvesvietas maiņu tuvākajos trīs gados, snieguši noliedzošu atbildi. Iespējamo dzīvesvietas maiņu ārpus novada apsvēruši 30% iedzīvotāju (skat.attēlu zemāk).

12.Vai apsverat dzīvesvietas maiņu tuvākajos trīs gados?



No atbildēm, kurās sniegts pamatojums dzīvesvietas maiņai, 71% par iemeslu dzīvesvietas maiņai norādījuši darba vietu trūkumu un zemo atalgojumu. Iedzīvotāji atzīmējuši arī šādas atbildes: dzīves kvalitātes uzlabošana, jaunas iespējas, bērnu izglītības iespējas, darba devēja attieksme, ražotņu likvidācija, indivīda vērtības nenovērtēšana, nav stabilitātes, iedzīvotāju skaita samazināšanās.

14.Vai Jūsu dzīves apstākļi ir uzlabojušies pēdējā gada laikā?



Atbildot uz jautājumu par dzīves apstākļu uzlabojumiem pēdējā gada laikā, 49% respondentu norādījuši, ka tie palikuši nemainīgi. Tas gan varētu būt skaidrojams ar

aptaujas dalībnieku nodarbošanos, jo 51% ir valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki. Pasliktinājušies dzīves apstākļi pēdējā gada laikā 25% respondentu, bet uzlabojušies 17%.

Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošana

Ilgspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanai noteikti uzraudzības rādītāji, lai novērtētu stratēģisko mērķu īstenošanas progresu un novada teritorijas attīstību. Analizējot rezultātos rādītājus, jāsecina, ka būtiskākie rādītāji - iedzīvotāju skaits samazinās un migrācijas negatīvais saldo pieaug, neskatoties uz pašvaldības darbības rezultātiem bezdarba samazināšanā, infrastruktūras sakārtošanā un izglītības pieejamībā.

Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ilgtermiņa uzraudzības pamatrādītāji

Mērķis	Rādītājs	Vērtība	2013.g. un attīstības tendence	2014.g. un attīstības tendence	Ilgtermiņā sasniedzamais rezultāts	Avots
Apturēt iedzīvotāju skaita straujo sarukšanu	Iedzīvotāju skaits	14972 (2013.gada 1.janvāris)	14606	14257	Stabils	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
	Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo	-139 (2012.gads)	-181	(CSP dati par 2014.gadu būs publicēti 08.06.2015.)	Samazinās negatīvais saldo	Centrālā statistikas pārvalde
Paaugstināt nodarbinātības iespējas	Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem	79 (CSP galīgie dati par 2012.gadu)	79	(CSP profizoriskie dati par 2013.gadu)	Pieaug	Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde
	Bezdarba līmenis %	17,6% (2013. gada marts)	16.6%	15.20%	Samazinās	Nodarbinātības valsts aģentūra
	Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju, EUR	286 (2012.gads)	312	337	Pieaug	Balvu novada pašvaldība
	Teritorijas attīstības indekss	-0.591 (82.vieta, 2012.gads)	-0.821 (91.vieta par 2013.gadu)	(Rādītāji par 2014.gadu nav publicēti)	Pieaug	Valsts reģionālās attīstības aģentūra

	Izglītības iestāžu audzēkņu skaits uz 1000 iedzīvotājiem vecumā līdz 62 gadiem (līdz pensijas vecumam)	190 (2013.gada septembris)	207	205	Pieaug	Balvu novada pašvaldība
Uzlabot pašvaldību, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbību	Sadarbības projektu skaits	-	5	8	Pieaug	Balvu novada pašvaldība
	Novada deputātu, administrācijas un sabiedrības kopīgu pasākumu skaits	-	2	2	Pieaug	Balvu novada pašvaldība
Ilgspējīgi apsaimniekot dabas resursus	Apstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars	67.2% (2013.gada oktobris)	81.7%	79.4%	Pieaug	Lauku atbalsta dienests, Balvu novada pašvaldība

Secinājumi

Attīstības programmas noteikto rīcību aktivitātes uzsāktas, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas, Eiropas Savienības fondu un programmu finanšu resursu pieejamību.

Balstoties uz 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu prognozēto pieejamību, aktualizētajā investīciju programmā 2014.-2017.gadam, iekļautas projektu aktivitātes, kas balstās uz darbības programmas „Nodarbinātība un izaugsme” un lauksaimniecības fonda definētajām prioritātēm.

Vidēja termiņa sasniedzamo rezultātu rezultatīvie rādītāji norāda uz neviennozīmīgi vērtējamu novada attīstību. Viens no galvenajiem rādītājiem iedzīvotāju skaits – pastāvīgi samazinās.

Aptaujas rezultātā iegūta informācija, kas liecina, ka, lai gan uzlabojas novada vispārējie ekonomiskie rādītāji – samazinās bezdarbs, pieaug darba alga, ir pieejami kvalitatīvi pakalpojumi, uzlabota infrastruktūra, tomēr ievērojama iedzīvotāju daļa vērtē savus dzīves apstākļus bez izmaiņām, vai tie ir pasliktinājusies. Iedzīvotāju skaits samazinās, pieaug demogrāfiskā slodze. Neapmierinošs vērtējums ir pašvaldības darbībai uzņēmējdarbības atbalsta un nodarbinātības veicināšanas aktivitātēs, negatīvs tas bija arī 2013.gada aptaujā uzraudzības ziņojuma ietvaros. Jāuzlabo darba kvalitāte jauniešu brīvā laika saturīgai pavadīšanai.

Pielikumā sniegta informācija par Investīciju programmas 2014-2017.gadam izpildi 2014.gadā.

Prioritātē 1 Veselīgi domājošs novads noteikta 41 aktivitāte, kuras jāveic 2014.gadā. Veiktas darbības 38 projektos, nav uzsākta darbība 3 aktivitātēs.

Prioritātē 2 Veselīgs novads noteiktas 19 aktivitātes, kuras jāveic 2014.gadā. Veiktas darbības 17 projektos, nav uzsākta darbība 2 projektos.

Prioritātē 3 Veselīga vide noteiktas 38 aktivitātes, kuras jāveic 2014.gadā. Veiktas darbības 35 projektos, nav uzsākta darbība 3 aktivitātēs.

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums sniedz informatīvu un analītisku informāciju, lai nodrošinātu izziņas materiālus, sasniegumu, pieļauto kļūdu un nepieciešamo pārmaiņu identificēšanai.

Pielikumā: Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2014.-2017.gadam izpilde 2014.gadā.

Ziņojumu sagatavoja
Finanšu un attīstības
nodaļas plānotāja
V.Vancāne

Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam

Investīciju programmas 2014.-2017.gadam izpilde 2014.gadā

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS													
M.1. IZGLĪTĪBAS UN INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBAS, PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANA UN ATTĪSTĪBA													
R.1 IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA UN ATTĪSTĪBA													
1	Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu, t.sk. profesionālās ievirzes, ēku rekonstrukcija, renovācija un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem	PR 1 M1 R1	2, 5 -11, 108, 114	1 200 000	15%	85% ESI fondi			Veikti remontu izglītības iestādēs Nodrošināta infrastruktūras sakārtošana	2014	4 gadi	Jā	Tiek īstenoti Balvu Valsts ģimnāzijas un Tilžas internātpamatskolas ēku nergoefektivitātes uzlabošanas projekti
2	Rotaļu laukumu labiekārtošana Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs	PR 1 M1 R1	1	70 000	10%	90% ELFLA			Rotaļu laukumi aprīkoti ar mūsdienīgām sporta aktivitāšu ierīcēm.	2014	4 gadi	Jā	2014.gadā labiekārtots Tilžas PII rotaļu laukums (uzstādīts jauns slidkalniņš)
3	Moderno tehnoloģiju nodrošinājums novada izglītības iestādēs	PR 1 M1 R1	4	40 000	15%	85% ESI fondi			Iegādāta datortehnika, modernizēts mācību process, nodrošināta moderno tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, kā arī mācību sociālā tīkla Mykoob un E-klases lietošana visās novada izglītības iestādēs.	2014	4 gadi	Jā	Pastāvīgi tiek atjaunota datortehnika un citas modernās tehnoloģijas

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
4	Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu iegāde vispārizglītojošām un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm	PR 1 M1 R1	3	40 000	15%	85%			Iegādātas mācību grāmatas, IT, sporta un mūzikas inventārs, un nodrošināta kvalitatīva, mūsdienu prasībām atbilstoša mācību priekšmetu apguve.	2014	4 gadi	Jā	No pašvaldības budžeta līdzekļiem līdzfinansēta mācību grāmatu un līdzekļu iegāde
5	Energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	PR 1 M1 R1	1	1 700 740	15%	85%			Nosiltinātas izglītības iestāžu ēkas Palielināts nosiltināto iestāžu ēku īpatsvars	2014	4 gadi	Jā	Nosiltinātas izglītības iestāžu ēkas Tilžas vidusskolai, Tilžas internātpamatskolai, Balvu Valsts ģimnāzijas internātam, PII "Pīlādītis"
6	Multifunkcionāla jauniešu centra ēkas energoefektivitātes uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana	PR 1 M 1 R 1		270 000	15%	85%	ESI fondi			2015	2 gadi	Jā	Projektu ietvaros iegādāts inventārs (vingrošanas matračī) izremontētas 2 telpas
7	Balvu Valsts ģimnāzijas ēku rekonstrukcija 1.kārta	PR 1 M1 R1	1, 9	945 430	15%	85%	ERAF		Pabeigta skolas ēku kompleksa rekonstrukcija	2013	2 gadi	Jā	Aktivitāte pabeigta, kopējais finansējums 1341830 EUR
8	Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra rekonstrukcija un apkārtnes sakārtošana	PR 1 M1 R1	8	50 000	100%				Uzlikts bruģa segums Balvu Tālākizglītības centra iekšpagalmā	2014	2 gads	Jā	Rekonstruētas ēkas āra kāpnes un ieklāts bruģis pieguļošajā teritorijā (pašvaldības finanšu līdzekļi)
9	Sporta laukumu un infrastruktūras sakārtošana Balvu novada izglītības iestādēs	PR 1 M1 R1	1, 12	270 000	40%	60%			Atjaunoti, paplašināti un sakārtoti stadioni un sporta laukumi	2015	3 gadi	Jā	Veikti priekšdarbi, izpēte futbola laukuma izveidei pie Balvu Valsts ģimnāzijas

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
10	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas vidusskolā	PR 1 M1 R1	1	220 664	42%	KPFI 58%			Nosiltināta skolas ēka	2014		Jā	Aktivitāte pabeigta, kopējais finansējums 309844 EUR
11	Balvu Valsts ģimnāzijas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana	PR 1 M1 R1		5 173	10%	ELFLA, LEADER 90%			Atjaunots inventārs skolas muzeja telpās	2014		Jā	Aktivitāte pabeigta, atjaunots inventārs skolas muzejā
12	Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs	PR 1 M1 R1	1	30 064	10% 2169	90% Latvijas- Šveices sadarbības programma			Uzlabota ugunsdrošības sistēma novada vispārējās izglītības iestādēs	2013	2	Jā	Aktivitāte pabeigta, Sadarbībā ar VRAA iekārtotas un pilnveidotas ugunsdrošības sistēmas Balvu Valsts ģimnāzijā, Stacijas pamatskolā, Tilžas vidusskolā, PII Ieviņa, Bērzkalnes pagasta PII, Tilžas internātpamatskolā 26529 EUR vērtībā
Pr.1.M.1. IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES UZLABOŠANA													
R.2. VISA VEIDA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA													
13	Programmas izstrāde par ZA Augstākās izglītības centra attīstību Balvos	PR 1 M1 R2	26, 27, 28, 30, 44	10 000	15%	85% ESF			Izstrādāta programma un aktivitāšu saraksts, kas jāveic, lai Balvi kļūtu par ZA Augstākās izglītības centru	2015	3 gadi		
14	Profesionālās izglītības iestādes izveide Balvos	PR 1 M 1 R 2	4			ESI fondi				2014	2 gadi	Jā	Aktivitāte pabeigta, izveidota Balvu profesionālā un vispārīzglītojošā vidusskola

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
15	Pirmsskolas izglītības iestāžu kā metodisko centru attīstīšana noteiktā pirmsskolas izglītības darbības virzienā	PR 1 M1 R2	4	1 000	100%				Aktivizēta pirmsskolas iestādes izvēlētās jomas izpēte un darbība, katra novada pirmsskolas iestāde ir metodiskās palīdzības sniedzējs un pieredzes bāze izvēlētajā jomā: PII "Sienāzītis"- matemātika, mūzika, sports pirmsskolas izglītībā; -Tilžas PII: lasīt mācīšana, svētku organizēšana pirmsskolā; - PII „Ieviņa”: bērnu sagatavošana pamatizglītības uzsākšanai (5-6 gad.bērniem); -PII "Pīlādītis": iepazīstināšana ar dabu, sports un sadarbība ar bērnu vecākiem.	2014	3 gadi	Jā	Aktivizēts darbs izvēlētajās jomās
16	Atbalsts vasaras nometņu organizēšanā Balvu novada pašvaldības skolēniem	PR 1 M 1 R 2		12 000		ESI fondi				2014	4 gadi	Jā	2014.gadā organizētas 8 vasaras nometnes novada skolniekiem
17	Tālākizglītības centra ēkas pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	PR 1 M1 R2	8	20 000	15%	85% ERAF SF			Tālākizglītības centra ēka pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	2015	2 gadi		

Pr.1.M.2. SAKĀRTOTA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE RADOŠAS UN INOVATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI

R.1. BIZNESĀ INKUBATORA DARBĪBAS PILNVEIDOŠANA

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
18	Aprīkojuma un informāciju tehnoloģiju iegāde augstas kvalitātes konsultatīvo pakalpojumu sniegšanai komercdarbības jomā	P 1 M 2 R 1	19, 20	4 900	40%	ELFLA 60%			Modernu tehnoloģiju izmantošana kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai	2014	2 gadi	Jā	Projekta ietvaros iegādāts inventārs (galdi, informatīvie stendi) uzņēmējdarbības atbalstam.
19	Biznesa centra darbības kapacitātes paaugstināšana, pilnveidojot uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus	P 1 M 2 R 1							Mateiāli tehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana efektīvai pakalpojumu sniegšanai uzņēmējiem	2014	4	Jā	Biznesa un tūrisma centrs tiek nodrošināts ar modernu drukas, skenēšanas un kopēšanas iekārtu, datortehniku.
20	Biznesa centra infrastruktūras uzlabošana e-pakalpojumu nodrošināšanai	P 1 M 2 R 1	29						Informatīvo tehnoloģiju uzlabošana e-pakalpojumu sniegšanai	2015			
21	Mazo grantu projektu uzņēmējdarbības atbalstam konkursa nolikuma izstrāde	P 1 M 2 R 1	33		100%				Izstrādāts nolikums, nodarbinātības paaugstināšanai	2016			
22	Biznesa plānu konkursa organizēšana jauno uzņēmēju atbalstam	P 1 M 2 R 1	32		100%				Organizēti konkursi, nodarbinātības paaugstināšana	2015			
23	Iedzīvotāju profesionālās kompetences pilnveidošanas darbnīcu izveide	P 1 M 2 R 1							Izveidotas darbnīcas, pilnveidotas prasmes	2015			
24	Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu ieviešana	P 1 M 2 R 1	29, 32		15%	85% ESI fondi			Izveidoti sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumi	2015	3 gadi		

Pr.1.M.2.R.2. UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

25	Projekts „Balvu novada Balvu pilsētas vidi degradējošo teritoriju sakārtošana uzņēmējdarbības perspektīvai plānošanai, rekonstruējot ielas, inženierkomunikāciju tīklus, ražošanas teritoriju attīstīšanai”	PR 1 M2	30	500 000	75 000	425 000 ERAF			Rekonstruētas virszemes un apakšzemes inženierkomunikāciju tīkli un asfaltbetona segums uz perspektīvās uzņēmējdarbības objektiem	2014.	4 gadi	Jā	Apzināti projekti un aktīviātes uzņēmējdarbības veicināšanai 2014.-2020.gada ESI fondu plānošanas periodam. Projekti un alternatīvie projekti iekļauti aktivizētās investīciju
----	---	----------------	----	---------	--------	---------------------	--	--	---	-------	--------	----	--

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
		R2											programmas pielikumā. Rīcības uzsāks 2015.gadā.
26	Industriālo zonu pievadinfrastruktūras sakārtošana	PR 1 M 2 R 2	25, 30	10 000 000		85% ESI fondi			Sakārtota pievadinfrastruktūra ražošanas zonām	2015	2gadi		
27	Infrastruktūras labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Tilžas pagastā	PR 1 M 2 R 2		4 712	1 207	ELFLA 3 505			Tirdzniecības nojumu izbūve un teritorijas labiekārtošana	2014		Jā	Projekta ietvaros izbūvēta tirdzniecības nojume un labiekārtots teritorijas klājums
28	Virzīt un ieviest uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras projektu ieviešanu (tehn. parks, eksp. ražotne, apmācību centrs u.tml)	PR 1 M2 R2	29	300 000	100%				Izstrādāts virzīšanas modelis, iesniegti projekti, izstrādāta finansējuma shēma, paredzēts līdzfinansējums.	2014.	4 gadi	Jā	2014.-2020.gada ESI fondu plānošanas periodam ir apzināti infrastruktūras objekti, kurus pieteikt projektu konkursam
29	Attālinātā darba centra(telpu) izveide	P 1 M 2 R 2	30	10 000	10%	85% ESI fondi			Izveidotas telpas nodarbinātības veicināšanai	2016			
30	Pašvaldības pārziņā esošas infrastruktūras attīstīšana un pielāgošana uzņēmējdarbības attīstības vajadzībām	PR 1 M2 R2	25-29	100 000	15%	85% ERAF			Pamatinfrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai	2015			
Pr.1.M.2.R.3. RADOŠAS UN INOVATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA													
31	Vietējo uzņēmēju un amatnieku produkcijas un pakalpojumu attīstība uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes	PR1 M2 R3	30	7000	15%	85% ESI fondi			Amatnieku, radošo industriju attīstības veicināšana, jaunu pakalpojumu izveide	2015	2 gadi		
32	Nodrošināt novada izglītības iestāžu iesaistīšanos Junior Achievement programmā	PR 1 M2	32-34	8 000	100%				Novada skolas iesaistās programmā	2014.	4 gadi	Jā	Novada izglītības iestādes regulāri tiek iesaistītas programmas

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
		R3											pasākumos.
33	Skolu ekonomikas skolotāju motivēšanas sistēma darbībai Junior Achievement (JAL) programmās	PR 1 M2 R3	32-34	50 000	100%				Skolotāji ir motivēti piedalīties JAL apmācību programmās	2014.	4 gadi	Nē	Motivēšanas sistēma nav ieviesta ierobežotu finanšu resursu dēļ.
34	Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) gadatirgu norisi novada skolās. Reklāma. Labāko apbalvošana.	PR 1 M2 R3	32-34	14 000	100%				Novadā notiek SMU gadatirgi	2014.	4 gadi	Jā	Skolēnu mācību uzņēmumi uzaicināti piedalīties novada zaļajos tirdziņos
35	Veicināt augstas kvalitātes tūrisma pakalpojumu attīstību Balvu novadā	PR 1 M2 R3		10 000	15%	85% ESI fondi			Ieviesti augstas kvalitātes tūrisma pakalpojumi, to skaits	2015			
36	Vietējo produktu attīstība un konkurētspējas uzlabošana	PR 1 M2 R3		20 000	15%	85% ESI fondi			Veikti pasākumi vietējo produktu konkurētspējas uzlabošanai	2014	4 gadi	Jā	Sadarbībā ar LUC organizēti 2 semināri- arodapmācība mājražotājiem. Preču zīme "Ražots Balvos" veicina novada uzņēmēju produkcijas atpazīstamību.
Pr.1.M.2.R.4. PĀRROBEŽU SADARBĪBA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI													
37	Pārrobežu biznesa sadarbības atbalsta centra izveidošana	PR1 M2 R4		80 000	15%	85% Eiropas teritoriālās sadarbības programmas			Starptautisku biznesa kontaktu izveidošanas atbalsts Nodarbinātības veicināšana	2015			
38	Pieredzes apmaiņa ar Krievijas un ES uzņēmējiem (pieredzes apmaiņas braucieni, izstādes, "apaļie galdi")	PR 1 M2	37	7 000	50%	50% Pārrobežu sadarbības programma			Uzņēmēju tikšanās, pieredzes apmaiņas braucieni, izstādes, apaļie galdi.	2014	4 gadi	Jā	Sadarbībā ar LUC organizēti uzņēmēju braucieni uz Mazpolijas reģionu

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
		R4											Polijā. Novada uzņēmējiem-amatniekiem organizēts brauciens uz gadatirgu Baltkrievijā.

Pr.1.M.3. NODROŠINĀTI KVALITATĪVI KULTŪRAS PAKALPOJUMI

R.1. NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN POPULARIZĒŠANA

39	Balvu novadam raksturīgā nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanas turpināšana	PR 1 M3 R1	40-47	7 000	20%	80%			Papildināta un saglabāta informācija par Balvu novada nemateriālo kultūras mantojumu	2014.	4 gadi	Jā	Apkopota un atjaunota novada nemateriālā mantojuma materiāli un iekļauti muzeja digitālajā ekspozīcijā
40	Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”	PR 1 M3 R1	39	958712	143483	815 229			Ierīkota digitālā ekspozīcija muižas klētī, jaunas ekspozīcijas izveide, amatu darbnīcas.	2013.	3 gadi	Jā	Pārrobežu programmas ietvaros tiek īstenots projekts muižas klētī
41	Projekts „Politiski represēto piemiņas saglabāšana”	PR 1 M3 R1	39	6 300	640	5 155			Labiekārtota komunistiskā genocīda upuru piemiņas vieta Kubulu pagasta Balvu stacijā	2013.	2 gads	Jā	Sadarbībā ar biedrību “Kubulu pagasta ģimeņu biedrība” labiekārtota piemiņas vieta Kubulu pagastā.
42	Keramikas tradīciju popularizēšana Balvu novadā	PR 1 M3 R1	39	6291	629	5662				2013.	2 gads	Jā	Biedrība "SAVI" īsteno projektu keramikas tradīciju veicināšanai.
43	Projekts „Tautas tērpu iegāde Balvu Valsts ģimnāzijas deju kolektīviem”	PR 1 M3 R1	39	4910	491	4419			Iegādāti tautas tērpi Balvu Valsts ģimnāzijas deju kolektīviem	2014.	1 gads	Jā	Tautu tērpu iegāde deju kolektīviem paredzēta 2015.gada budžeta ietvaros.
44	Pasākumi, lai nodrošinātu Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma iekļaušanu UNESCO sarakstā.	PR 1 M3	39, 40, 45	22 000	15%	85%			Īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma iekļaušanu UNESCO sarakstā.	2014.	3 gadi	Jā	No 2014.gada 13.līdz 19.oktobrī UNESCO kultūras mantojuma nedēļas pasākumu ietvaros

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
		R1											notikuši šādi pasākumi: "Baltijas ceļa stunda", "Baltijas ceļa stāsti", seminārs " Saglabājot Pasaules atmiņu"
45	Projekts „Ziemeļlatgales Nemateriālā kultūrvēstures mantojuma centra izveide ”	PR 1 M3 R1	39, 44	360 000	15%	85%			Veikta Balvu muižas klēts rekonstrukcija, izstrādāts Ziemeļlatgales nemateriālā kultūrvēstures mantojuma centra interjera, pastāvīgās un digitālās ekspozīcijas projekts, iegādāts nemateriālā kultūras mantojuma liecību vākšanai nepieciešamais tehniskais nodrošinājums, savākti, apstrādāti, atlasīti, tulkoti, ievadīti (digitalizācijai) dati , izgatavots un uzstādīts ekspozīciju interjers, izstrādāta un uzstādīta programmatūra, izstrādāta animāciju un digitālā ekspozīcija, apmācīti darbinieki, veikta projekta prezentācija, publicitāte, iekļaušana tūrisma aprīvē	2013.	3 gadi	Jā	Ierīkota digitālā ekspozīcija Balvu Novada muzejā.

Pr.1.M.3.R3 KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA UN MĀRKETINGŠ

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
46	Festivālu tradīciju turpināšana (Amatierteātru festivāls „Ķiršu dārzs”, Kamermūzikas festivāls, Starptautiskais deju festivāls „Eima, eima” u.c.)	PR 1 M3 R3	50-57	20 000	20%	80%			Nodrošināti kvalitatīvi festivāli un šo festivālu tradīciju turpināšana	2014	4 gadi	Jā	Turpinās amatierteātru festivāls " "Ķiršu dārzs", Balvu kamermūzikas festivāls, " deju festivāls " Eima, eima"
47	Jaunu kultūras produktu veidu apzināšana un ieviešana	PR 1 M3 R3	39, 46	5000	20%	80%			Izveidoti inovatīvi un tikai Balvu novadam raksturīgi kultūras produkti	2014	4 gadi	Jā	Tiek izveidoti jauni un pilnveidoti kultūras produkti, piemēram, Starptautiskais bērnu un jauniešu talantu un modes festivāls " Modes pakāpieni"
Pr.1.M.3.R.4. KULTŪRAS INFRASTRUKTŪRAS SAKARTOŠANA UN ATTĪSTĪBA													
48	Projekts „Balvu centrālā bibliotēka kā reģiona informācijas resursu centrs”	PR 1 M3 R4	40, 54, 58	334 400	15%	85%			Izstrādāts projekts divstāvu piebūvei, veikti piebūves celtniecības darbi, laukuma labiekārtošana, iegādāts tehniskais nodrošinājums, ieviesti jauni mūsdienīgi pakalpojumi, izveidots nemateriālā kultūras mantojuma informācijas centrs uz Balvu centrālās bibliotēkas Kultūrvēstures datubāzes pamata	2015	2 gadi		
49	Balvu muižas apbūves kompleksa attīstība	PR 1 M3	52, 51, 40, 8	700 000	15%	85%			Veikta muižas kompleksa izpēte, izstrādāts tehniskais projekts un saskaņots	2014	3 gadi	Nē	ES fondu pieeja no 2016.gada, aktivitātei laika nobīde

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
		R4							Būvniecības, restaurācijas, rekonstrukcijas, labiekārtošanas darbu veikšanai, izstrādātas un īstenotas kultūras, izglītības un tūrisma programmas un piedāvājumi				
50	Krucifiksu atjaunošana Viksnas pagastā	PR 1 M3 R4	63	1454	145	1309	ELFLA		Krucifiksu atjaunošana Strautu ciemā un katoļu baznīcas dārzā	2014	1 gads	Jā	Aktivitāte pabeigta. Projekta ietvaros atjaunots krucifisks Viksnas pagastā
51	Kultūrvēsturisko, t.sk. sakrālo objektu atjaunošana un saglabāšana, piemēram, Bērzu kapliča	PR1 M3 R4		85 839	15%	85%	EEZ			2014	3 gadi	Jā	Sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju sagatavota tehniskās izpētes dokumentācija, kā arī uzsākti tehniskās dokumentācijas izstrādes pasākumi
52	Atbalsts valsts un vietējo kultūras pieminekļu izpētei un renovācijai	PR 1 M3 R4		30 000	10%	90%	ESI fondi		Kultūras pieminekļu saglabāšana	2015	3 gadi		
53	Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkas rekonstrukcija	PR 1 M3 R4	52-58	400 000	15%	85%	KPFI		Uzsākta Balvu Kultūras un atpūtas centra tehniskās dokumentācijas izstrāde un ēkas rekonstrukcija	2014	3 gadi	Nē	Aktivitāti uzsāks līdz ES fondu līdzekļu pieejamību 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
54	Balvu Centrālās bibliotēkas rekonstrukcija – piebūve, plauktu nomaiņa, kāpņu pielāgošana publiskās lietošanas institūcijas vajadzībām, ventilācijas ierīkošana lašitavās, ēkas pamatu izolācija, pirmā stāva grīdu kravnesības pielāgošana bibliotēkas specifikai; laukuma labiekārtošana	PR 1 M3 R4	48	400 000	15%	85%			Veikta bibliotēkas rekonstrukcija	2016	3 gadi		
55	Kultūras un brīvā laika, dziesmu svētku procesa pieejamības nodrošināšana	PR1 M3 R4		100 000	15%	85%			Renovēta brīvdabas estrāde Bavu pilsētas parkā	2015	3 gadi		
56	Atpūtas vietu labiekārtošana Balvu novadā	PR 1 M3 R4	141,	30000	10%	ELFLA, LEADER aktivitāte				2015	3 gadi		
57	Bibliotēku telpu un iekārtu renovācija Balvu novadā	PR 1 M3 R4		25 000	10%	90% ELFLA				2014	4 gadi	Jā	2014.gadā Bērnu un metodiskai nodaļai iegādātas jaunas mēbeles 899EUR vērtībā, veikti tehniskie aprēķini Centrālās bibliotēkas ventilācijas uzlabošanai. Filiālbibliotēkai Balvu pagastā nosiltināti giesti.
58	Datortehnikas nomaiņa publiski pieejamos internetpunktos pašvaldības bibliotēkās	PR 1 M3 R4	54, 48	78 258	15%	85% ERAF				2015	2 gadi		
59	Projekts " Museum Gateway"	PR 1 M3	49, 51	47 362	7 105	40 257 LAT-LIT-			Gleznu krātuves un izstāžu zāles aprīkojuma,	2013	3 gadi	Jā	2014.gadā noslēdzies projekts Latvijas-

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
		R4				BY			datortehnikas, fototehnikas iegāde, muižas laika tērpu izgatavošana novada muzejā				Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu programmas ietvaros. Veikta aprīkojuma, dator un foto tehnikas iegāde.

Pr.1.M.3.R.5. PĀRROBEŽU SADARBĪBAS VEICINĀŠANA KULTŪRAS JOMĀ

60	Starptautisku kultūras pasākumu organizēšana un novada amatiermākslas kolektīvu dalība pasākumos	PR 1 M3 R5	46.47	10 000	10%	90%			Veiksmīgi noorganizēti starptautiskie kultūras pasākumi	2014	4 gadi	Jā	Amatierteātru festivālā "Ķiršu dārzs" piedalījās arī Baltkrievijas Republikas Dokšicu amatierteātris.
61	Vadošo kultūras nozares darbinieku pieredzes apmaiņa sadarbībā ar citu valstu kultūras iestādēm	PR 1 M3 R5	59	5 000	10%	90%			Kultūras darbinieku ārvalstīs gūtās pieredzes nodošana novadā	2014	4 gadi	Jā	Organizēti braucieni uz Baltkrievijas Republiku pieredzes apmaiņai.
62	Pārrobežu sadarbības veicināšana kultūras jomā (starptautisko pasākumu organizēšana un kultūras darbinieku pieredzes apmaiņa)	PR 1 M3 R5	46	10 000		90%			Kultūras darbinieku ārvalstīs gūtās pieredzes nodošana novadā	2016			

Pr.1.M.4. ADMINISTRATĪVO FUNKCIJU EFEKTIVITĀTES NODROŠINĀŠANA

R.1. PAŠVALDĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA

63	Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana apgūstot citu pašvaldību pieredzi.	PR 1 M4 R1	64	30 000	30%	70%			Notiek regulāra pieredzes apmaiņa ar citām Latvijas un ārzemju pašvaldībām; izstrādāti jauni pakalpojumu veidi sabiedrībai, paaugstināta pakalpojumu kvalitāte; paaugstināta darbinieku	2014	4 gadi	Jā	Pieredzes apmaiņas braucieni uz Baltkrievijas Republikas Dokšicu pašvaldību, Latvijas pašvaldībām
64	Pasākumu īstenošana sabiedrības drošības paaugstināšanai	PR 1 M4 R1	63	250 000	15%	85%			Ieviesti pasākumi, kas uzlabo sabiedrības drošību.	2015	3 gadi		

Pr.1.M.4.R.2. KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS, LABAS PĀRVALDĪBAS PRINCĪPU IEVIEŠANA PAŠVALDĪBĀ

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
65	E-paraksta ieviešana	PR 1 M4 R2	66, 67	50 000	15%	85%			Pašvaldības iestādes var saņemt un nosūtīt elektroniski parakstītus dokumentus.	2015	4 gadi		
66	E-paraksta ieviešana pašvaldībā	PR 1 M4 R2		2 500					Pašvaldības iestādes var saņemt un nosūtīt elektroniski parakstītus dokumentus.	2015			
67	Elektroniskās dokumentu vadības sistēmas izveide visās novada pašvaldības iestādēs.	PR 1 M4 R2	65, 66, 67	100 000	15%	85%			Visās iestādēs ir izveidota dokumentu elektroniskā vadības sistēma	2015	3 gadi		
68	Elektroniski sniegto pakalpojumu izstrāde un sniegšana sabiedrībai	PR 1 M4 R2	66-67	20 000	15%	85%			Visus pakalpojumus, kurus sniedz Balvu novada pašvaldība un tās iestāde ir pieejami elektroniski.	2015	3 gadi		
69	Nevalstisko organizāciju mājas(saieta telpu) iekārtošana Balvu novadā	PR1 M4 R2		30 000	10%	90%			Iekārtotas telpas NVO darbības atbalstam	2016			
Pr.1.M.4.R.3. VIENAS PIETURAS AĢENTŪRAS IZVEIDE PAŠVALDĪBĀ													
70	Vienas pieturas aģentūras izveidošana Balvu novada administratīvajā centrā un pagastos	PR 1 M4 R3	65-69	30 000	15%	85%			Balvos ir izveidota vienas pieturas aģentūra, kurā jebkurš novada iedzīvotājs var saņemt visus Balvu novada pašvaldības piedāvātos pakalpojumus	2015	2 gadi		
Pr. 2. VESELĪGS NOVADS													
M.1. SOCIĀLO UN VESELĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA													
R.1. SOCIĀLĀS APRŪPES, REHABILITĀCIJAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA													
71	Nakts patversmes infrastruktūras uzlabošana un pilnveidošana Balvos	PR2 M1 R1		10 000 EUR					Pārbūvētas dušas telpas, tualete, inventāra iegāde, darba telpas izveide	2016	2 gadi		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
72	Izveidot rehabilitācijas centru vientuļām mātēm ar nepilngadīgiem bērniem, kurām ir zemas sociālās prasmes un pilngadību sasniegušiem jauniešiem pēc atgriešanās no bērnu namiem	PR 2 M1 R1	71	50 000	15%	85%			Radīta iespēja Sociālā dienesta Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas speciālistiem veikt profesionālu sociālo darbu ar minētu mērķa grupu un sagatavot tos patstāvīgai dzīvei ārpus rehabilitācijas centra	2015	2 gads		
73	Nodrošināt vienu sociālo darbinieku uz 1000 iedzīvotājiem pilsētā un vienu sociālo darbinieku uz pilnu slodzi katrā pagastā ar atbilstošu kvalifikāciju	PR 2 M1 R1	71-76	6 000 gadā	100%				Iedzīvotājiem sociālais darbinieks pieejams katru darba dienu; Iespēja kvalitatīvi veikt sociālo darbu ar ģimenēm	2012	2 gadi	Jā	Balvu pilsētā nodrošināta sociālo darbinieku pieejamība atbilstoši plānotajam, amata likmes jāpaaugstina Bērzkalnes un Lazdulejas pagastos.
74	Darba organizācijas struktūras pilnveide Sociālajā dienestā un "Pansionātā "Balvi"" atbilstoši labās prakses piemēriem valstī.	PR 2 M1 R1	71-76	20 000 gadā	100%				Izveidota laba pārvaldība sociālajā jomā novadā	2014	2 gadi	Jā	Labas pārvaldības principi būs nodrošināti īstenojot multifunkcionālā sociālo pakalpojuma centra projektu, arī pensionātā, iemītnieku uzturēšanās maksu nosakot pēc pensionāta iemītnieku slimības diagnozes un funkcionālajām spējām.
75	Sociālā dienesta ēku pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	PR 2 M1 R1	71-76	30 000	15%	85%			Pielāgošanas rezultātā pārbūvēta ieeja, ārdurvis un sanitārie mezgli, kāpņu telpu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atbilstoši normatīvajām prasībām	2015	3 gadi		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
76	Balvu novada pašvaldības „Pansionāta „Balvi”” darbības pilnveidošana	PR 2 M1 R1	74, 87	50 000	15%	85%			Izveidotas sociālās gultas, nodrošinot Islaicīgas uzturēšanās iespējas novada iedzīv. pēc smagām slimībām vai atsevišķos gadījumos - ģimenes apstākļu dēļ; Ieviestas jaunas štata vienības (ārsta palīgs, masieris , fizioterapeits); Ierīkotas drošības pogas guļošiem pacientiem; Pielāgots pensionāta transports personu ar īpašām vajadzībām	2016	2 gadi		
77	Samariešu atbalsts mājās	PR 2 M1 R1				ESF			Dažādoti sociālie pakalpojumi	2014	2 gadi	Jā	Sadarbībā ar Larvijas Samariešu apvienību projektu ietvaros nodrošināti mobili sociālie pakalpojumi klientiem mājās.
78	Sociālo dzīvojamo māju infrastruktūras sakārtošana	PR 2 M1 R1		100 000		ESI fondi			Renovēta infrastruktūra	2016	2 gadi		
79	Veselības veicināšanas aktivitāšu plāna izstrāde un ieviešana	PR 2 M1 R1	71-81	20 000	15%	85%			Izstrādāts veselības veicināšanas pasākumu plāns; uzsākta plāna ieviešana	2014	2 gadi	Jā	Noris plāna izstrāde un saskaņošana. Noslēguma termiņš-2015.gads
Pr. 2.M.1.R.2. SOCIĀLO ATBALSTA PASĀKUMU PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA													
80	Izveidot novadā sociālās mājas ģimenēm ar bērniem	PR 2 M1 R2	80-81	300 000	15%	85%			Izveidotas sociālās mājas ģimenēm ar bērniem visā novada teritorijā	2014	4 gadi	Jā	Tiek risināts jautājums par šāda pakalpojuma nodrošināšanu nākotnē

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
81	Pārrobežu sadarbības projekts par sadarbības tīkla izveidi sociālo pakalpojumu pilnveidošanai bērniem un jauniešiem ar invaliditāti Balvu novadā.	PR2 M1 R2	83	100 000	15%	85% ESI fondi			Sociālo pakalpojumu nodrošināšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti	2017			
82	Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana Balvu pilsētā	PR 2 M1 R2		7 000	20%		80%		Sniegts atbalsts vistrūcīgākajiem Balvu pilsētas iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem	2014	4 gadi	Jā	Sadarbībā ar NVO nodrošināti Zupas virtuves pakalpojumi Balvu muižas ēkā
83	Rehabilitācijas centra bērniem un jauniešiem ar nopietnām psiholoģiskām un uzvedības problēmām izveide	PR 2 M1 R2	81	40 000	15%	85% ESI fondi			Rehabilitātes centra izveide	2014	4 gadi	Jā	Ir izstrādāta koncepcija par multifunkcionāla sociālo pakalpojuma centra izveidi. Centrā būtu pieejami rehabilitācijas pakalpojumi jauniešiem un bērniem ar psiholoģiskām un uzvedības problēmām.
84	Alternatīvo pakalpojumu nodrošināšana Dienas centrā Balvu novadā	PR 2 M1 R2		50 000	15%	85% ESI fondi			Radošo darbnīcu izveide, motivācijas programmu īstenošana	2015	4 gadi		
85	Atpūtas vietu izveidošana bērniem invalīdiem, jauniešiem ar uzvedības problēmām, radošām aktivitātēm brīvā dabā	PR 2 M1 R2		8000	10%	90% ELFLA			Izveidota atpūtas vieta bērniem ar īpašām vajadzībām Sociālajam dienestam pieguļošajā teritorijā	2015			
86	Divu sociālo dzīvokļu izveide un remonts Balvu novada Briežuciema pagastā	PR 2 M1 R2		7000	15%	85% ESI fondi			Izveidoti sociālie dzīvokļi	2015			

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
87	Specializēto darbinīcu izveide pansionātā "Balvi"	PR2 M1 R2	76	30 000	15%	85%			Sociālās rehabilitācijas pasākumu rezultātā sniegts atbalsts pansionāta iemītniekiem	2015			

Pr.2.M.2. SPORTA UN VESELĪGAS ATPŪTAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA

R.1. SPORTA INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA

88	Sporta inventāra iegāde un papildināšana Balvu novada pašvaldības iestādēs sporta aktivitāšu nodrošināšanai	PR 2 M2 R1		70 000	15%	85%			Inventāra nodrošināšana iestādēm sporta vajadzībām novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām	2014	4 gadi	Jā	Pašvaldības budžeta iespēju robežās tiek piešķirts finansējums sporta inventāra iegādēm izglītības iestādēs
89	Balvu pilsētas stadiona renovācija Balvos (drenāžas, skrejceļu seguma nomaiņa, tribīnes, treniņu zāles ierīkošana, skrejceļu ierīkošana zem tribīnēm, sacensību	PR 2 M2 R1	89-93	1 500 000	15%	85%			Sakārtota sacensību noteikumiem atbilstoša vieglatlētikas bāze, kuru izmanto valsts, novada un starptautisko sacensību un mācību treniņu noietu	2015	2 gadi		

Pr.2.M.2.R2. SPORTA PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA UN POPULARIZĒŠANA

90	Novada sporta pasākumu organizēšana visos novada populārākajos sporta veidos	PR 2 M 2 R2	91-94	1 000	100%				Kvalitatīvie sporta pasākumi dažādos sporta veidos	2014	4 gadi	Jā	2014.gadā organizēti pasākumi šādos sporta veidos: telpu futbola turnīrs, minifutbola čempionāts, volejbola
91	Draudzības sacensību organizēšana pierobežu sadarbības ietvaros vairākos sporta veidos	PR 2 M 2 R 2	90-92	10 000	15%	85%			Komplekso sacensību organizēšana, pārrobežu valsts pieredzēs apmaiņa	2014	3 gadi	Jā	Pārrobežu futbola turnīrs bērniem un jauniešiem (piedalās komandas no Igaunijas un Lietuvas)
92	Ģimeņu svētku organizēšana	PR 2 M 2 R 2	90-92	6 000	100%				Komplekso sacensību organizēšana, pārrobežu valsts pieredzēs apmaiņa	2014	4 gadi	Jā	2014.gadā organizēti kārtējie ģimeņu sporta svētki
93	Tiesnešu apmācības semināru organizēšana dažādos sporta veidos	PR 2 M 2 R 2	90-91, 94	1 500	100%				Kvalitatīvie sporta tiesneši dažādos sporta veidos	2017	2 gadi		
94	Latvijas Jaunatnes Olimpiādes	PR 2	93	15 000	100%				Komplekso valsts mēroga	2017	2 gadi		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
	organizēšana	M 2 R 2							sacensību organizēšana				
PR.2.M.2.R.3. VESELĪGAS ATPŪTAS INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA													
95	Bērnu rotaļu laukumu izveide Balvu novadā	PR 2 M 2 R 3	99-101	10 000	0	90%			Izbūvēts bērnu rotaļu laukumi – Balvu pilsētā un pagastos	2014	1 gads	Jā	Pašvaldība līdzfinansējusi Nīderlandes fonda KNHM projekta ietvaros bērnu rotaļu laukuma pilnveidošanu Dārza ielas māju iekšpagalmā.
96	Velotūrisma attīstība Balvu novadā- veloseliņu būvniecība	PR 2 M 2 R 3	101	500 000	15%	85%				2016			
97	Sporta bāzu kārtējie kosmētiskie remontu	PR 2 M 2 R 3	98	30 000	100%				Regulāri tiek remontētas un uzturētas novada sporta bāzes.	2014	4 gadi	Jā	Katru gadu tiek atjaunotas sporta zāļu grīdu līniju marķējums un lakojums vispārīzglītojošās skolās.
98	Sporta bāzu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem ar funkcionālām traucējumiem	PR 2 M 2 R 3	97	50 000	15%	85%			Novada iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai	2015	1 gads		
99	Apgaismotas slēpošanas trases izbūve	PR 2 M 2 R 3	101	20 000	15%	85%			Izbūvēta apgaismota slēpošanas trase Balvu pilsētas parkā gar ezera krastu.	2017	1 gads		
100	Netradicionālo sporta veidu infrastruktūras izveidošana (bmx, skeitpark, rampas)	PR 2 M 2 R 3	101	150 000	15%	85%			Izveidots skeitparks, BMX trase un rampas.	2015	2 gadi		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
101	Brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas iespēju pilnveidošana Balvu novada iedzīvotājiem	PR 2 M2 R3		6 037	602	5435			Āra trenāžieru un skeitrampas uzstādīšana Balvos	2014	1 gads	Jā	Sadarbībā ar biedrību "Radošās Idejas" projekta ietvaros uzstādīti āra trenāžieri un skeitrampa pie Balvu Valsts ģimnāzijas.

PR.2.M.2.R4. VESELĪGAS ATPŪTAS PASĀKUMU POPULARIZĒŠANA

102	Netradicionālo sporta veidu un tautas sporta veidu sacensību organizēšana	PR 2 M 2 R 4	106, 105, 104	10 000	15%	85%			Novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai	2014	4 gadi	Jā	Organizēti galda spēļu spēles, ielu sacensības (Balvi Open Street), florbola turnīrs, spinningošanas un velcēšanas sacensības (Ne asakas!), Skrējiens apkārt Balvu ezeram.
103	Tautas slēpojuma organizēšana 4 posmos	PR 2 M 2 R 4		1 000	100%				Novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai	2014	4 gadi	Nē	Slēpošanas trase nav izveidota, nav slēpošanas inventāra
104	Riteņbraukšanas sacensību organizēšana tautas klasē 2 etapi	PR 2 M 2 R 4	102	1 000	100%				Novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai	2014	4 gadi	Nē	Sacensības nav organizētas dalībnieku drošības inventāra (ķiveres) trūkuma dēļ.
105	Sacensību organizēšana iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām	PR 2 M 2 R 4	102	2 000	15%	85%		ESF	Novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai	2014	4 gadi	Jā	Sporta centra un Balvu novada invalīdu biedrības sadarbība treniņu organizēšanā (šautriņu mešana, uc.)
106	Dienas un nakts orientēšanas kauss tautas klasē	PR 2 M 2 R 4	102	1 000	100%				Novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai	2014	4 gadi	Jā	2014.gadā organizētas orientēšanās sacensības 6 posmos

Pr. 3 VESELĪGA VIDE

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
M.1. VEIDI DRAUDZĪGA SAIMNIECISKA DARBĪBA													
R.1. ENERGOEFEKTIVITĀTE													
107	Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana	PR 3 M 1 R 1	2		15%	85%				2014	4gadi	Jā	Pašvaldības ēkai Bērzpils ielā 1A izstrādāts tehniskais
108	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā	PR 3 M 1 R 1	107, 2	391 652	202468	189184				2014	2gadi	Jā	2014.gadā uzsākts projekts - Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā 361651 EUR vērtībā
109	Pašvaldības daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšana	PR 3 M 1 R 1	107		15%	85%				2014	4gadi	Jā	Māju apsaimniekotājs veicis daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabojumus Balvu pilsētā: Bērzpils ielā 12, Baznīcas ielā 14 (juntu nomaīņa).
110	Kubulu pagasta daudzdzīvokļu mājas pie pansionāta energoefektivitātes paaugstināšana	PR3 M1 R1	113, 107	216 717		85% KPMF				2014	2 gadi	Jā	Veikts mājas jumta remonts Kubulu pagastā.
111	Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā; II, III kārtā	PR3 M1 R1	112	200 000		KPMF			Energoekonomisko spuldžu uzstādīšana teritoriju apgaismojumā CO ₂ izmešu samazinājums	2014	4gadi	Jā	Apzinātas ielas, kurām perspektīvā nepieciešams efektīvāks apgaismojums. Projekti tiks uzsākti līdz KPMF līdzekļu pieejamību.

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
112	Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā; I kārtā	PR3 M1 R1	111, 132	151 702		KPFI			Energoekonomisko spuldžu uzstādīšana CO ₂ izmešu samazinājums	2013	2gadi	Jā	2014.gadā noslēgusies KPFI projekta 1.kārta 145846 EUR vērtībā
113	Veicināt dzīvokļu īpašnieku līdzekļu ieguldīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanā	PR 3 M 1 R 1	111-113	16 000	100%				Siltumenerģijas ekonomija, ēku ekspluatācijas laika paildzinājums Atbalstīto iedzīvotāju aktivitāšu skaits	2014	4 gadi	Jā	Organizēti izglītojošie pasākumi par māju siltināšanas iespējām. ES fondu līdzekļi ēku siltināšanai 2014.gadā nav pieejami.
114	Balvu Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes uzlabošana	PR 3 M 1 R 1	2, 107	8540 EUR	100%				Siltumenerģijas ekonomija nomainot siltumsūkni	2014		Jā	Par pašvaldības budžeta līdzekļiem nomainīts siltumsūknis 8540 EUR vērtībā.
115	Modernas elektroenerģijas attālas vadības uzskaites sistēmas ieviešana pašvaldības sektorā	PR 3 M 1 R 1		20 000	15%	85%			Pilotprojekts, kas rastu iespēju konstatēt neracionālu elektroenerģijas patēriņu ļautu samazināt un optimizēt elektrības patēriņu	2016	2 gadi		
116	Biomases kurināmā uzglabāšanas apstākļu uzlabošana	PR 3 M 1 R 1		50 000	15%	85%			Izbūvētas kurināmā prasībām atbilstošas novietnes, lai nepasliktinātu tās fizikāli – ķīmiskās īpašības, aptuveni 70% no pašvaldības kurināmā novietnēm ir aktuāla renovācija vai jaunu	2015	2 gadi		
117	Modernizētu ielu apgaismojuma sistēmu ar "kustību sensoriem" uzstādīšana	PR 3 M 1 R 1		30 000	15%	85%			Sensoru uzstādīšana apdzīvotajās vietās, kur ir intensīva, bet nevienmērīga cilvēku	2015	2 gadi		
118	Pašvaldības autoparka modernizācija dodot priekšroku	PR 3 M 1		30 000	15%	85%			Mērķis - samazināt transporta autoparka	2017	2 gadi		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
	transportlīdzekļiem ar zēmāku vidējo degvielas patēriņu un turpmākā perspektīva – atjaunojamo energoresursu izmantošana	R 1				KPFI			degvielas vidējo patēriņu par 10 %				
119	Velosipēdu ar elektropiedziņu iegāde, lai nodrošinātu pašvaldības, t.sk. sociālo darbinieku pārvietošanos piemērotās situācijās	PR 3 M 1 R 1		10 000	15%	85% ESI fondi KPFI			Nodrošināta pašvaldības un sociālo darbinieku pārvietošanos piemērotās situācijās samazinot CO2 izmešus	2016	2 gadi		
PR.3.M.1.R.2. VEIĒI DRAUDZĪGAS ENERĢIJAS UN DABAS RESURSU IZMANTOŠANA													
120	Alternatīvo enerģijas avotu uzstādīšana enerģijas ražošanai projektu realizācijas veicināšanai un informatīvais atbalsts mājsaimniecībām.	PR 3 M 1 R 2	121		15%	85% ESI fondi KPFI			Projektu alternatīvo enerģijas avotu uzstādīšanai veicināšanai un informatīvais atbalsts mājsaimniecībām (3	2016	3 gadi		
121	Atjaunojamo energoresursu izmantošana elektrības ražošanā	PR 3 M 1 R 2	120		15%	85% ESI fondi KPFI			Kā izglītojošs uzskates objekts (piem. ielu apgaismojumā, vides u.c. objektos). Pilotprojekts 1 kW	2016	2 gadi		
PR.3.M.1.R.3. CEĻU UN SAKARU INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA UN ATTĪSTĪBA													
122	Platjoslas optisko pieslēgumu nodrošināšana pilsētā un pagastu centros	PR 3 M 1 R 3	123	15000	15%	85% ESI fondi			Saziņas kvalitātes uzlabošana internetvidē	2015	2 gadi		
123	Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzlabošana publiskās interneta pieejas punktos	PR 3 M 1 R 3	122	78 300	15%	85% ESI fondi			Modernu iekārtu un ātrgaitas interneta nodrošināšana	2015	2 gadi		
124	Balvu pilsētas ielu programmas ieviešana	PR 3 M 1 R 3	125	2 000 000	300 000	1700 000			Sakārtotas pilsētas ielas atbilstoši izstrādātajai programmai	2014	4 gadi	Jā	Pilsētas ielu rekonstrukciju darbi notiek balstoties uz programmā norādītajām nepieciešamībām
125	Balvu novada pašvaldības ceļu infrastruktūras rekonstrukcija	PR 3 M 1	124, 126	3 000 000	0	85% ESI fondi			Ceļu seguma atjaunošana un rekonstrukcija	2014	4 gadi	Jā	ES fondu projektu ietvaros rekonstruētas

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
		R 3											Brīvības ielu posms, uzsāks darbus arī Liepu ielā.
126	Lauku ceļu rekonstrukcija pieejamības un uzņēmējdarbības veicināšanai	PR 3 M 1 R 3	124	1 500 000	0	90%			Ceļu seguma atjaunošana un rekonstrukcija	2014	4 gadi	Jā	Apzināti ceļi, kuru klātni uzlabojot, tiks uzlabotas uzņēmējdarbības iespējas. Rekonstrukcijas darbi tiks uzsākti līdz ar ES fondu līdzekļu pieejamību.
127	Balvu pilsētas apvedceļa 15km rekonstrukcija un izbūve	PR 3 M 1 R 3	125	8 449 997					Optimālas transporta plūsmas nodrošināšana	2018	3 gadi		
128	Novada ārējās sasniedzamības uzlabošana, attīstot visu veida transporta infrastruktūru, t.sk. dzelzceļa atzaru uz Krievijas Federāciju	PR 3 M 1 R 3	129,130	900 000	15%	85%			Attīstīta transporta infrastruktūra novada ārējai sasniedzamībai	2014	4 gadi	Jā	Sadarbojoties ar Gulbenes un Viļakas novadu vadībām, Satiksmes ministrijā norādīts uz dzelzceļa atjaunošanas nepieciešamību
129	Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka	PR 3 M 1 R 3	124-127	2 312 546	15%	85%			Asfaltbetona seguma atjaunošana, inženierkomunikāciju sakārtošana	2013	2 gadi	Jā	Turpinās ERAF projekts 3283030 EUR vērtībā
130	Ēnergoekonomiska ielu apgaismojuma izbūve novada apdzīvotās vietās	PR 3 M 1 R 3	130		15%	85%			Izbūvēts efektīvs ielu apgaismojums	2014	4 gadi	Jā	Projektu ietvaros uzstādīts LED apgaismojums ielās lauku apdzīvotās
131	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Balvu pilsētā (I, II, III kārtā)	PR 3 M 1 R 3	124	150 000	15%	85%			Rekonstruēts ielu apgaismojums	2014	3 gadi	Jā	Pabeigta projekta I.kārta 145846 EUR vērtībā
132	Videonovērošanas sistēmas sakārtošana un paplašināšana	PR 3 M 1		50 000	15%	85%			Darbojas un tiek paplašināta video	2015	3 gadi		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
	Balvu novadā, 2.kārta	R 3							novērošanas sistēma Balvu				
PR.3.M.1.R.4. KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANA UN ATTĪSTĪBA													
133	Ūdenssaimniecības attīstība Kubulu pagasta Kurnas ciemā	PR 3 M 1 R 4	134-136	456 586	157 893	298 691			Jauna ūdensvada un kanalizācijas vada būvniecība un esošo rekonstrukcija, jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve, jaunas artēziskās akas izbūve un esošo	2014	2 gadi	Jā	Uzsākta projekta īstenošana 689133 EUR vērtībā.
134	Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana	PR 3 M 1 R 4	133-140	378 515	15%	85%			Kritisko ūdensvada posmu 0,47 km rekonstrukcija; jaunu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana esošo NAI vietā; jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve ar jaudu 10 m3/h; jauna spiedvada izbūve 0,055km garumā, esošā kanalizācijas tīkla rekonstrukcija, garumā; jauna kanalizācijas vada	2013	2 gadi	Jā	Norit projekta īstenošana 538578 EUR vērtībā.
135	Vienotas lietus ūdens novades sistēmas projekta izstrādāšana un ieviešana Balvos.	PR 3 M 1 R 4	129-133	800 000	15%	85%			Izstrādāts projekts par lietus ūdens vienotu novades sistēmu Balvu pilsētā. Uzsākta tā	2018	3 gadi		
136	Ūdens skaitītāju uzstādīšana pie novada pašvaldībai un tās iestādēm piederošajām ēkām .	PR 3 M 1 R 4	129-132	15 000	100%				Uzstādīti ūdens skaitītāji. Iestāžu īpatsvars ar uzstādītiem ūdens skaitītājiem	2014	3 gadi	Jā	Balvu pilsētā, kā arī Balvu un Bērzkalnes pagastos pašvaldības ēkās uzstādīti ūdens skaitītāji. Pārējās administratīvajās vienībās aktivitātes tiks veiktas budžeta līdzekļu iespēju robežās.
137	Naftas produktu uztveršanas iekārtas uzstādīšana pie Pelnupes ietecē Bolupē.	PR 3 M 1	136-140	7 000	15%	85%			Uzstādīta naftas produktu uztveres iekārta.	2014	katru gadu	Jā	Bonas iepirkta un tiek uzstādīta Pelnupes no maija līdz

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
		R 4											septembrim
138	Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība , III kārtā	PR3 M1 R4		2 000 000	15%	85%			Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve individuālo māju sektorā	2015	3 gadi		
139	Kanalizācijas tīklu sistēmas sakārtošana Balvu pilsētā	PR3 M1 R4		85 000	100%				Hidrodinamiskās mašīnas iegāde p/a San-tex pilsētas komunikāciju kvalitatīvai uzturēšanai	2014		Nē	Pašvaldības ierobežoto finanšu resursu apstākļos, speciālās mašīnas iegādei līdzekļi nav piešķirti
140	Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Balvu novadā	PR3 M1 R4	133-140	120 000	15%	85%			Komunikāciju rekonstrukcija pagastu administratīvajos centros	2015	3 gadi		
PR.3.M.1.R.5. DEGRADĒTO TERITORIJU SAKOPŠANA UN IEKĻAUSĀNA SAIMNIECISKAJĀ DARBĪBĀ													
141	Pastaigas takas un atpūtas vietas izveide Tilžas upes krastā	PR 3 M 1 R 5		16 000	40%	60%			Teritorijas labiekārtošana	2016	1 gads		
142	Degradēto objektu un teritoriju revitalizācija	PR 3 M 1 R 5	141	50 000	15%	85%				2014	4 gadi	Jā	Noteiktas teritorijas un iekļautas ES fondu jaunajā plānošanas perioda projektu aktivitātēs uzņēmējdarbības veicināšanai
PR.3.M.1.R.6. VESELĪGAS, EKOĻOĢISKAS PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UN TIRDZNICĪBAS VEICINĀŠANA													
143	Zaļā iepirkuma vadlīniju izstrāde atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procedūrām novadā	PR3 M1 R6	143	3000	100%					2014	1gads	Nē	Budžeta līdzekļu nepietiekoša finansējuma apstākļos aktivitāte nav veikta.
144	Atzinības zīmes izveide uzņēmumiem, kuru produkcija atbilst izstrādātajiem atbilstības kritērijiem	PR3 M1 R6	144	3000	100%					2015	1gads		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
145	Lauku dienu organizēšana un veselīgas bioloģiskās pārtikas audzēšanas un lietošanas popularizēšana	PR 3 M 1 R 6	143	1 000	100%				Organizētas Lauku dienas	2014	4 gadi	Jā	Pašvaldība katru gadu finansiāli atbalsta Lauku dienu organizēšanu.
146	Zaļo tirdziņu izveide Bērzpilī un Tilžā.	PR 3 M 1 R 6	143,145	20 000	40%	60% ELFLA			Izveidoti Zaļie tirdziņi Bērzpilī un Tilžā	2014	2 gadi	Jā	Izbūvēta tirdzniecības vieta Tilžā.
147	Zivju resursu izpēte, dažādošana un pavairošana Balvu novada publiskajās ūdenstilpnēs	PR 3 M 1 R 6	152	10 000	10%		90% Zivju fonds	Mākslīgi palielināti zivju resursu krājumi, ņemot vērā resursu izpēti	2014	2 gadi	Jā	2014.gada īstenoti divi Zivju fonda projekti zivju resursu palielināšanai Balvu un Pērkonu ezeros.	

PR.3.M.2. LAUKU UN PILSĒTAS ZAĻO TERITORIJU SAKOPŠANA UN IZMANTOŠANA

R.1. DABAS TERITORIJU SAKOPŠANA UN IZMANTOŠANA IEDZĪVOTĀJU AKTĪVAI ATPŪTAI

148	Projekts "Rekreācijas zonas izveidošana pie Balvu ezera"	PR 3 M 2 R 1		1 000 000	150 000	850 000 ERAF			Izstrādāts tehniskais projekts, veikti būvniecības darbi, izplatīta	2015	1 gads		
149	Izstrādāt aktīvās atpūtas attīstības programmu / stratēģiju	PR 3 M 2 R 1	150	300	15%	85% Pārrobežu programma			Izstrādāta un ieviesta aktīvās atpūtas attīstības programma	2015	1 gads		
150	Labiekārtojamo teritoriju apzināšana un projektu/skiču projektu izstrāde un realizācija	PR 3 M 2 R 1	149,151	5 000	100%				Labiekārtotas teritorijas aktīvai atpūtai, izstrādāto skiču projektu skaits, to īstenošana	2015	3 gadi		
151	Jaunu vides objektu, mazo arhitektūras formu izveide Balvos	PR 3 M 2 R 1	150	20 000	40%	60% ELFLA			Jaunu vides objektu izveidošana, mazo arhitektūras formu izveidošana. Labiekārtoto vietu skaits.	2014	4 gadi	Jā	Balvu ezerā izveidots vides objekts "Ezera sonāte". Aktivitāšu īstenošana turpināsies pēc 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu projektu izsludināšanas.

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
152	Balvu novada publisko ezeru resursu pētījums un ilgtspējīgas attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde	PR3 M2 R1	147	25 000	15%	85% ESI fondi				2015			
153	Veikt pētījumu un izstrādāt plānu, kā veikt Balvu ezeru ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu un to izmantošanu iedzīvotāju atpūtai	PR 3 M 2 R 1	147	50 000	15%	85% ESI fondi			Pētījums par Balvu ezeru ekoloģisko stāvokli; programma ar pasākumiem, kas veicami ezeru ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un aktivitātēm ezeru izmantošanai iedzīvotāju atpūtai.	2015	2 gadi		
154	Veikt pētījumu un izstrādāt plānu, kā veikt Balvu un Raicenes ezeru ekoloģiskā stāvokli un to saimniecisko izmantošanu	PR 3 M 2 R 1	147	100 000	15%	85% ESI fondi				2016			
PR.3.M.2.R.2. DABAS TERITORIJU PĀRDOMĀTA IEKĻAUSĀNA TŪRISMA PROJEKTOS													
155	Vienota tūrisma stratēģijas izstrāde	PR 3 M 2 R 2	150-152	10 000	15%	85% ESI fondi			dalība vienota tūrisma stratēģijas Latgalē izstrādē	2014	2 gadi	Jā	Noris darbs pie tūrisma stratēģijas izstrādes
156	Izstrādāt vienotus tūrisma maršrutus (kartes, norādes, brošūra, mājas lapā un citos mēdijos)	PR 3 M 2 R 2	152-158	10 000	15%	85% Pārrobežu sadarbības programma			Tūristu skaits, pieaugums	2014	4 gadi	Jā	Izstrādāti tūrisma maršruti un izveidoti bukleti (Ar pasi pa pierobežu, latv.un angļu val.), 4 dažādas maršrutu kartes

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
157	Pastaigu takas izveide uz Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli- līcas apmetni	PR 3 M 2 R 2	156	24 189	15%	85%			Takas izveide, informatīvo stenda uzstādīšana	2016			
158	Izbūvēt sabiedriskās tualetes Balvu novada administratīvajos centros	PR 3 M 2 R 2	153-158	10 000	15%	85%			Uzstādīto vai uzbūvēto WC skaits	2014	4 gadi	Jā	Vasaras sezonā tiek nodrošinātas pārvietojamās tualetes
159	Atjaunot pašvaldības teritorijā atrodošos dabas kultūras pieminekļus (norādes, sakopta teritorija) 15 objekti	PR 3 M 2 R 2	153-158	20 000	15%	85%			Kultūras vēstures pieminekļu skaits, kas atjaunoti, pieejami sabiedrībai	2014	3 gadi	Jā	Pašvaldība, sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, piesaista finanšu līdzekļus Bērzu baznīcas , Bērzu kapu kapličas restaurācijai un atjaunošanai.
160	Iekļaut kultūrvēsturisko mantojumu tūrisma piedāvājumā (baznīcas, senkapi) (brošūrās, norādes) kopā 35 objekti	PR 3 M 2 R 2	155, 156	7 000	100%				Tūristu skaits, pieaugums	2014	4 gadi	Jā	Apzināti un iekļauti maršrutos, bukletos novada kultūrvēsturiskie objekti.
161	Tūrisma norādes zīmju un informatīvo karšu stendu izgatavošana un uzstādīšana Balvu novadā (Tūrisma infrastruktūras attīstība)	PR 3 M 2 R 2	156	6402	1640	4762			Tūrisma norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana -25; informatīvo karšu stendu izgatavošana un uzstādīšana- 5	2014	1 gads	Jā	Es fonda ietvaros īstenots projekts uzstādot informatīvos stendus un tūrisma zīmes
PR.3.M.2.R.3. CIEMU UN PILSĒTAS ZAĻO TERITORIJU INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA													
162	Veicināt pludmaļu attīstību, nodrošinot publisko ūdeņu pieejamību	PR 3 M 2 R 3	163, 164,166, 172, 173	30 000	40%	60%			Labiekārtoto pludmaļu skaits	2015	3 gadi		
163	Izstrādāt Balvu muižas apkārtnes labiekārtošanas un ēkas	PR 3	160-172	1 500 000	10%	90%			Izstrādāts projekts un sāks realizēt	2015	2 gadi		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
	rekonstrukcijas projektus un uzsākt to realizāciju	M 2 R 3						Pārrobežu sadarbības programma					
164	Izstrādāt vienotu pilsētas un pagastu centru apstādījumu veidošanas, uzturēšanas un kopšanas pamatnosacījumus, kā arī izstrādāt skiču projektus	PR 3 M 2 R 3	163-172	10 000	100%				Jaunu apstādījumu platību iekārtošana, rekonstrukcija (ha)	2015	2 gadi		
165	Paredzēt reklāmas izvietojamībai atbilstošas vietas un izkārtnu dizainu un to realizāciju (kopā 30)	PR 3 M 2 R 3	162-176	21 000	100%				Investīcijas reklāmas izvietojamībai	2014	3 gadi	Nē	Tiek diskutēts jautājums vai reklāmas izvietojamībai vietu dizainu veidot vienotu novadā vai katrai administratīvajai vienībai unikālu.
166	Balvu pilsētas Lāča dārza rekonstrukcijas projekta īstenošana	PR 3 M 2 R 3	162-172	600 000	15%	85%			Labiekārtota teritorija	2015	3 gadi		
167	Balvu pilsētas parka koku retināšanas projekta īstenošana	PR 3 M 2 R 3	162-176	40 000	100%				Izzāģēti bojātie, kaltušie koki	2014	4 gadi	Jā	Pašvaldība regulāri veic bojāto un nokaltušo koku izzāģēšanu
168	Vienoti afixu nesēji novadā	PR 3 M 2 R 3	162-172	20 000	100%				Uzstādīti vienoti afixu nesēji novadā (5 pilsētā; 10 pagastu centros)	2015	2 gadi		
169	Parku un atpūtas vietu sakārtošana, izveidošana un attīstīšana novadā	PR 3 M 2 R 3	162-172	300 000	15%	85%			Veikti sakārtošanas un attīstīšanas darbi novada teritorijā esošajiem parkiem	2015	3 gads		
170	Novada kapu infrastruktūras sakārtošana	PR 3 M 2			15%	85%			Atkritumu konteineru uzstādīšana	2014	4 gadi	Jā	Atkritumu savākšanai pie kapsētām vietas

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums		
		R 3				ELFLA							norobežotas ar dēļu nožogojumu (finansējums no pašvaldības budžeta)
171	Gājēju atpūtai paredzētu soliņu izgatavošana un izvietošana pilsētā un pagastos.	PR 3 M 2 R 3	162-172	15 000	50%	50% ELFLA			Uzstādīti vairāk kā 50 soliņi.	2014	4 gadi	Jā	No pašvaldības finansējuma regulāri tiek uzturēta vides infrastruktūra, pēc iedzīvotāju ieteikumiem tiek uzstādīti papildus soliņi
172	Projekts " Ezera sonāte"	PR 3 M 2 R 3	163, 159	8 632	10% 864	90% ELFLA LEADER aktivitāte			Vides elements - izgaismota peldošā strūklaka Balvu ezerā	2014		Jā	Sadarbībā ar biedrību "Balvu teātris" īstenots projekts "Ezera sonāte" un uzstādīta strūklaka Balvu ezerā .
PR.3.M.2.R.4. NOVADA AINAVAS KONCEPCIJAS IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA													
173	Veikt vidi degradējošo objektu apzināšanu, novērtēšanu un to sakārtošanas plānu izstrādi, teritoriju revitalizāciju	PR 3 M 2 R 4	150	50 000	100%				Sakārtošanas plānu skaits un realizētie projekti	2014	4 gadi	Jā	Būvvaldes speciālisti veic ikgadēju būvju apsekošanu, lai apzinātu degradējošos objektus un noteiktu sakārtošanas plānu.
